

Navrhovaný harmonogram a členění výstavby - SŠ chovu koní a jezdeckví Kladruby nad Labem – rekonstrukce DM

Plánovaná doba rekonstrukce je **9 měsíců**.

červené části:

m.č. 5.02-5.11

4.02-4.11

3.02-3.11

2.02-2.11

1.02-1.18, vyjma 1.14 chodby u jídelny

0.01-0.17

Práce možné po celou dobu rekonstrukce.
1.-9.měsíc

Stávající páteřní rozvody ELE, ÚT, vody a kanalizace musí však zůstat zachováni v provozu kromě 2 měs. letních prázdnin a do zprovoznění nových.

zelená část:

m.č. 5.12-5.46

Práce možné od již od 2. měsíce do 7. měsíce rekonstrukce.

Nutné odpojení páteřních přívodů ELE, ÚT, vody a kanalizace při zachování provozu DM ve 2., 3., 4. n.p.

modré části:

m.č. 4.12-4.46

3.12-3.46

2.12-2.46

5.01, 4.01, 3.01, 2.01, 1.01, 1.14(chodba u jídelny)

Práce možné pouze 2 měsíce o prázdninách, resp. 6.-7. měsíc rekonstrukce. Mimo tuto dobu budou chodby se schodištěm s omezeným provozem pro stavbu.


šedé části:

Částečně řešené prostory - vyznačeno ve výkresech - demontáž stávajících a montáž nových instalací ELE, ÚT, ZTI.

Práce možné po celou dobu rekonstrukce.

1.-9.měsíc

Stávající páteřní rozvody ELE, ÚT, vody a kanalizace musí však zůstat zachováni v provozu kromě 2 měs. letních prázdnin a do zprovoznění nových.

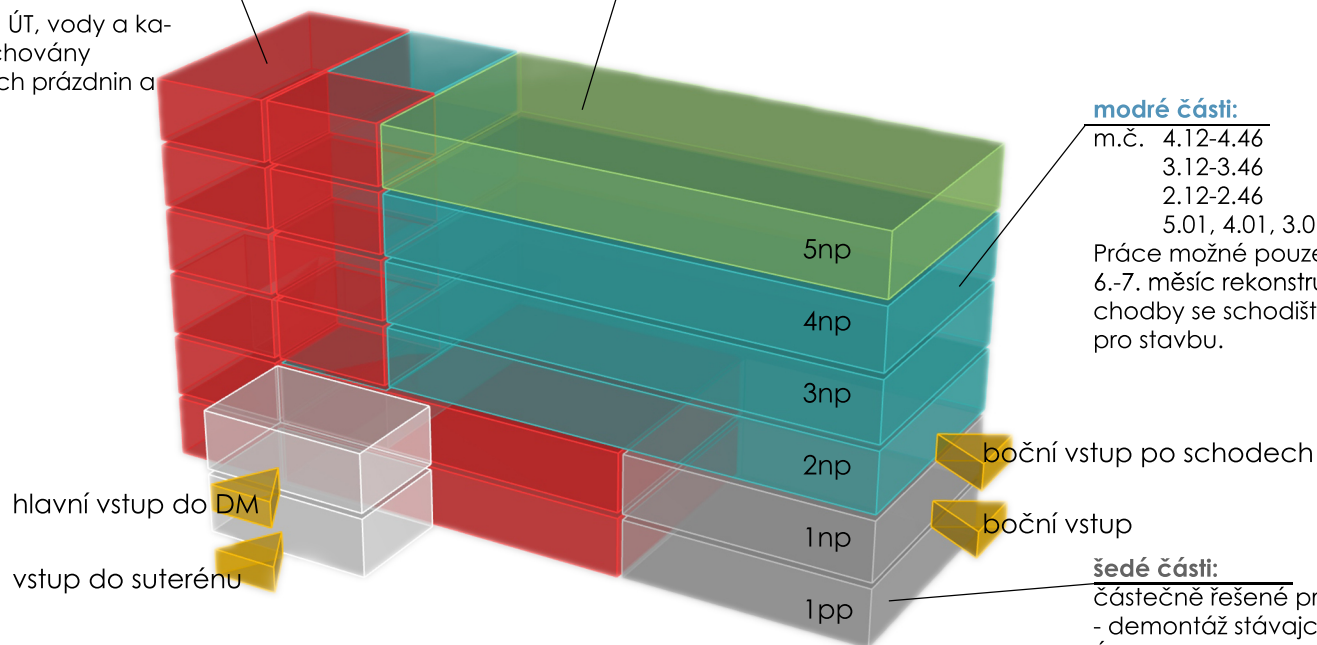

Poznámky:

- m.č. jsou uvedeny dle výkresů stávajícího stavu
- boční vstupy a vstup do suterénu budou k dispozici pro stavbu po celou dobu rekonstrukce
- hlavní vstup včetně haly se schodištěm budou k dispozici s provozními omezeními během školního roku, kdy budou v DM ubytované dívky. Viz také položky čištění podlah a prachotěsné přičky v zadání, v části Architektonicko stavební řešení.
