

Podklad pro harmonogram prací v rámci plnění veřejné zakázky dle Výzvy k podání nabídky

„Krajský úřad Pk, budova č.p. 12, Pardubice - posílení silno a slaboproudých rozvodů“

P25V00000303


- Obecné zásady související s technickým zajištěním, režimem prováděných prací atd. jsou uvedeny v Protokolu o technické připravenosti staveniště (příloha č. 4 Výzvy).
- Termín realizace díla: do 160 dní (tj. 23 týdnů) od předání staveniště
- 6 týdnů se předpokládá na fázi přípravných prací zahrnujících:
 - zaměření všech kanceláří: zaměření kanceláří bude probíhat za provozu Krajského úřadu a dohledu pověřených pracovníků úřadu
 - přípravu zámečnických a truhlářských prvků, kabelových žlabů, lišt apod.: tyto práce nelze provádět v prostorách úřadu
- 17 týdnů se předpokládá na instalaci kabelových tras, kabeláže a datových rozvaděčů
Vzhledem k rozlehlosti objektu a kabelových tras bude instalace elektrorozvodů rozdělena do 6 etap:
 - etapa 1 : 15 kanceláří, 3. patro doleva, předpoklad realizace 2-3 týdny
 - etapa 2 : 11 kanceláří, 3. patro doprava, předpoklad realizace 2-3 týdny
 - etapa 3 : 16 kanceláří, 4. patro doleva, předpoklad realizace 3 týdny
 - etapa 4 : 10 kanceláří, 4. patro doprava, předpoklad realizace 2-3 týdny
 - etapa 5 : 20 kanceláří, 3. patro zákoutí, předpoklad realizace 4 týdny
 - etapa 6 : 14 kanceláří, 4. patro zákoutí, předpoklad realizace 2-3 týdny
- další informace k jednotlivým etapám, viz níže - Etapizace prací
- Jednotlivé etapy instalace kabeláže, kabelových tras a dalších prvků se nesmí prolínat!
- Zahájení realizace následující etapy je možné pouze za podmínky, že jsou funkční slaboproudé rozvody a kanceláře připravené k provozu, a to v rozsahu díla odpovídající etapě předcházející. Zahájení každé etapy bude odsouhlaseno zástupcem objednatele.
Není nutné dodržet realizaci etap dle výše uvedeného pořadí, z harmonogramu musí být pořadí etap zřejmý
- Veškeré elektroinstalační a realizační práce v prostorách serveroven budou prováděny pouze po předchozí konzultaci s pracovníky IT oddělení a za nepřetržitého dohledu ze strany krajského úřadu.
- Stavební, montážní a instalační práce – zajistit v maximální míře omezení prašnosti (zakrytí všech zařízení, odsávání prachu)

Etapizace prací Rozvody budova B

Etapizace prací Rozvody budova B


Etap 1: 3. patro dlouhá chodba od 2335 doleva

- velký rozsah
- dotčených 14+1 kanceláří
- + místnost 2134
- je možné začít v místech zasahujících jen přímo dotčené kanceláře – 2346 a 2348 – trasa ven přes chodbu, průvrt do 2134

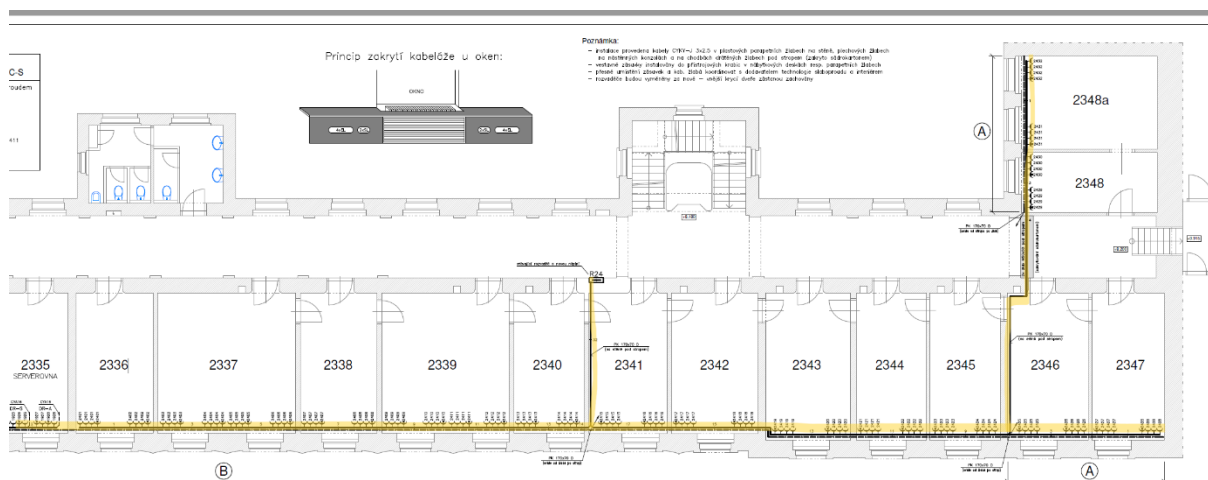


Etap 2: 3. patro dlouhá chodba od 2335 doprava

- dotčených 11 kanceláří včetně vedoucího Odboru rozvoje
- 2332 přívod do R19 – bude realizováno v rámci jiné zakázky (realizace ve stejnou dobu)

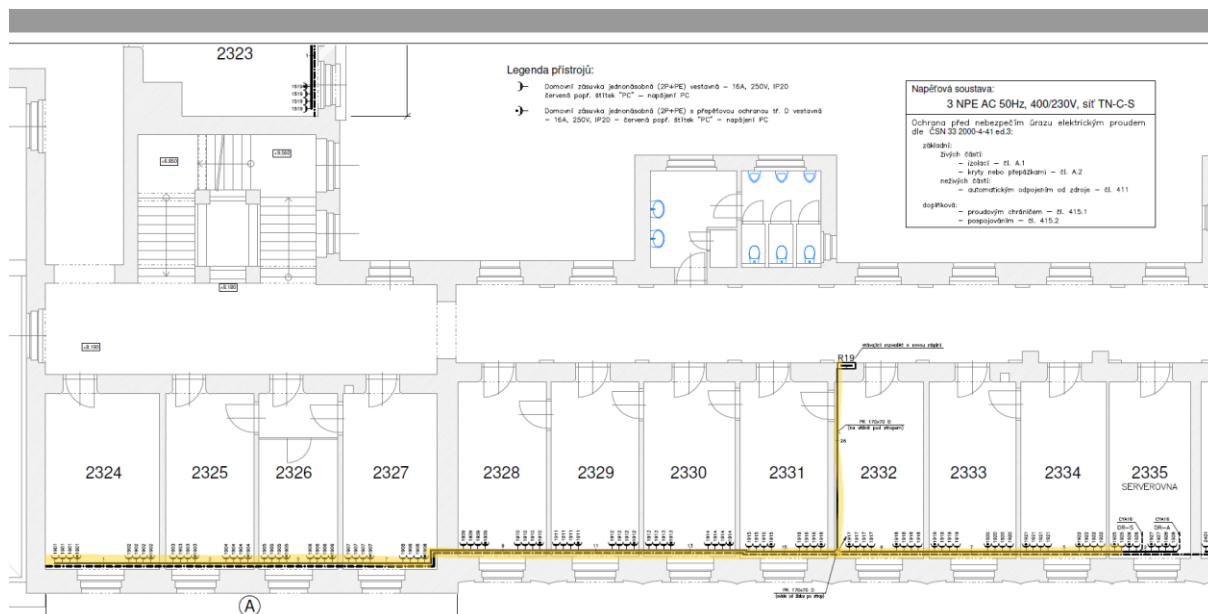


Etapa 3: 4. patro dlouhá chodba od 2433 doleva

- velký rozsah, dotčených 16 kanceláří
- 2433 průvrt přes patro do 2335
- 2445 (zasedačka) trasa ven přes chodbu směr 2447

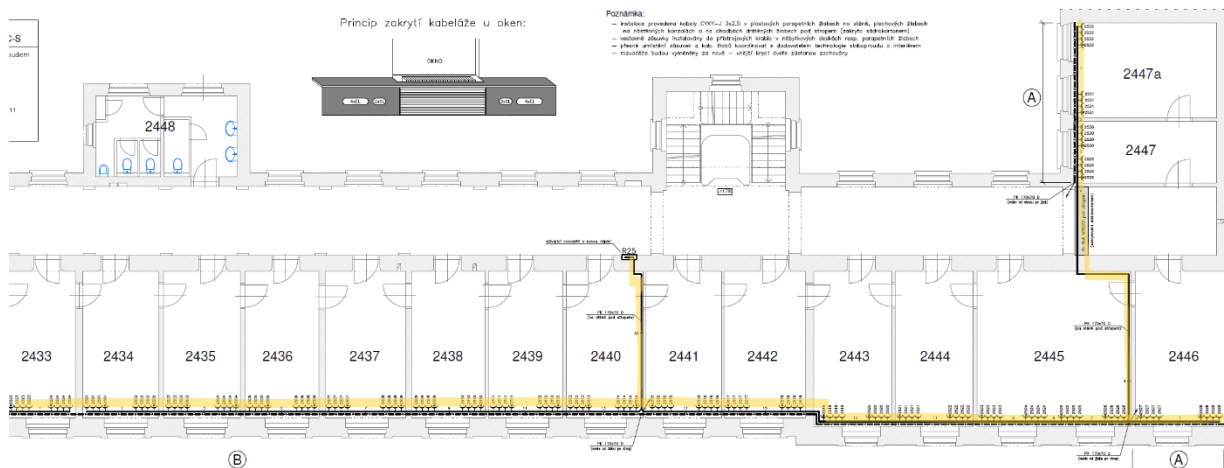


Etapa 4: 4. patro dlouhá chodba od 2433 doprava

- menší rozsah, dotčených 10 kanceláří včetně vedoucího Odboru školství
- 2433 průchod přes patro směr 2335

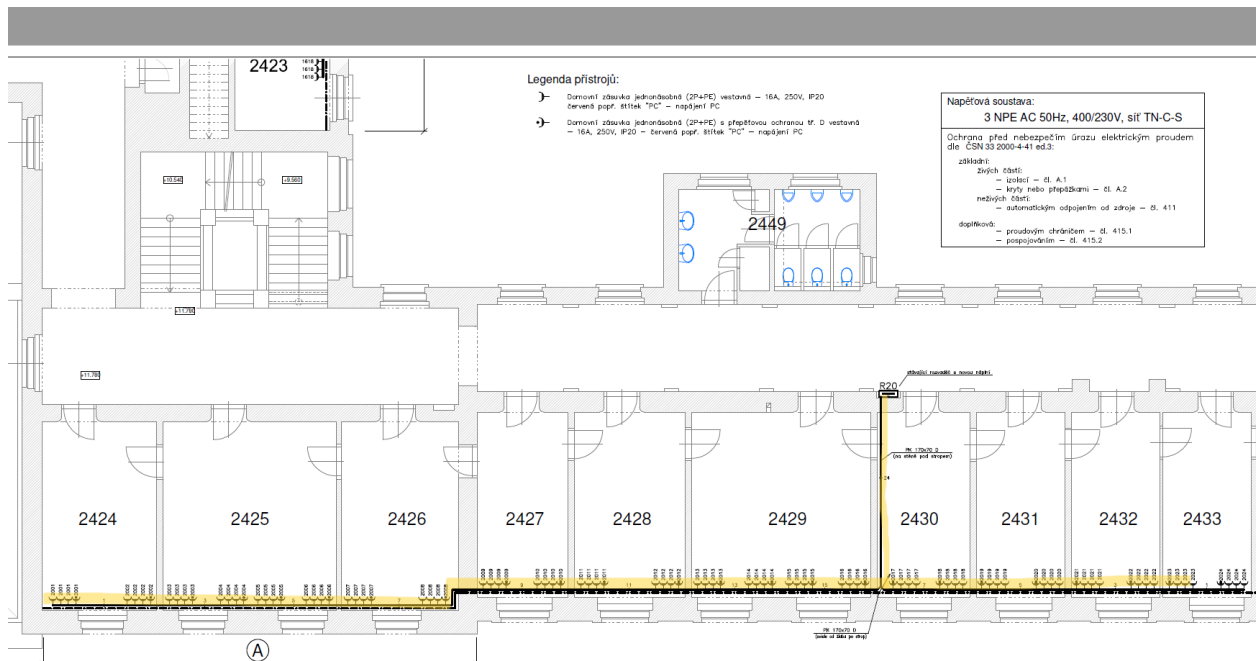

Etapa 5: 3. patro „zákoutí“ nad halou u „zubrů“

- velký rozsah, dotčeno 20 kanceláří včetně vedoucího Odboru financí
- z hlediska vystěhování kanceláří lze rozdělit na několik podetap (označeno barevně)
- 2302, 2303 a 2304 trasa pod stropem
- průvrt do 2219

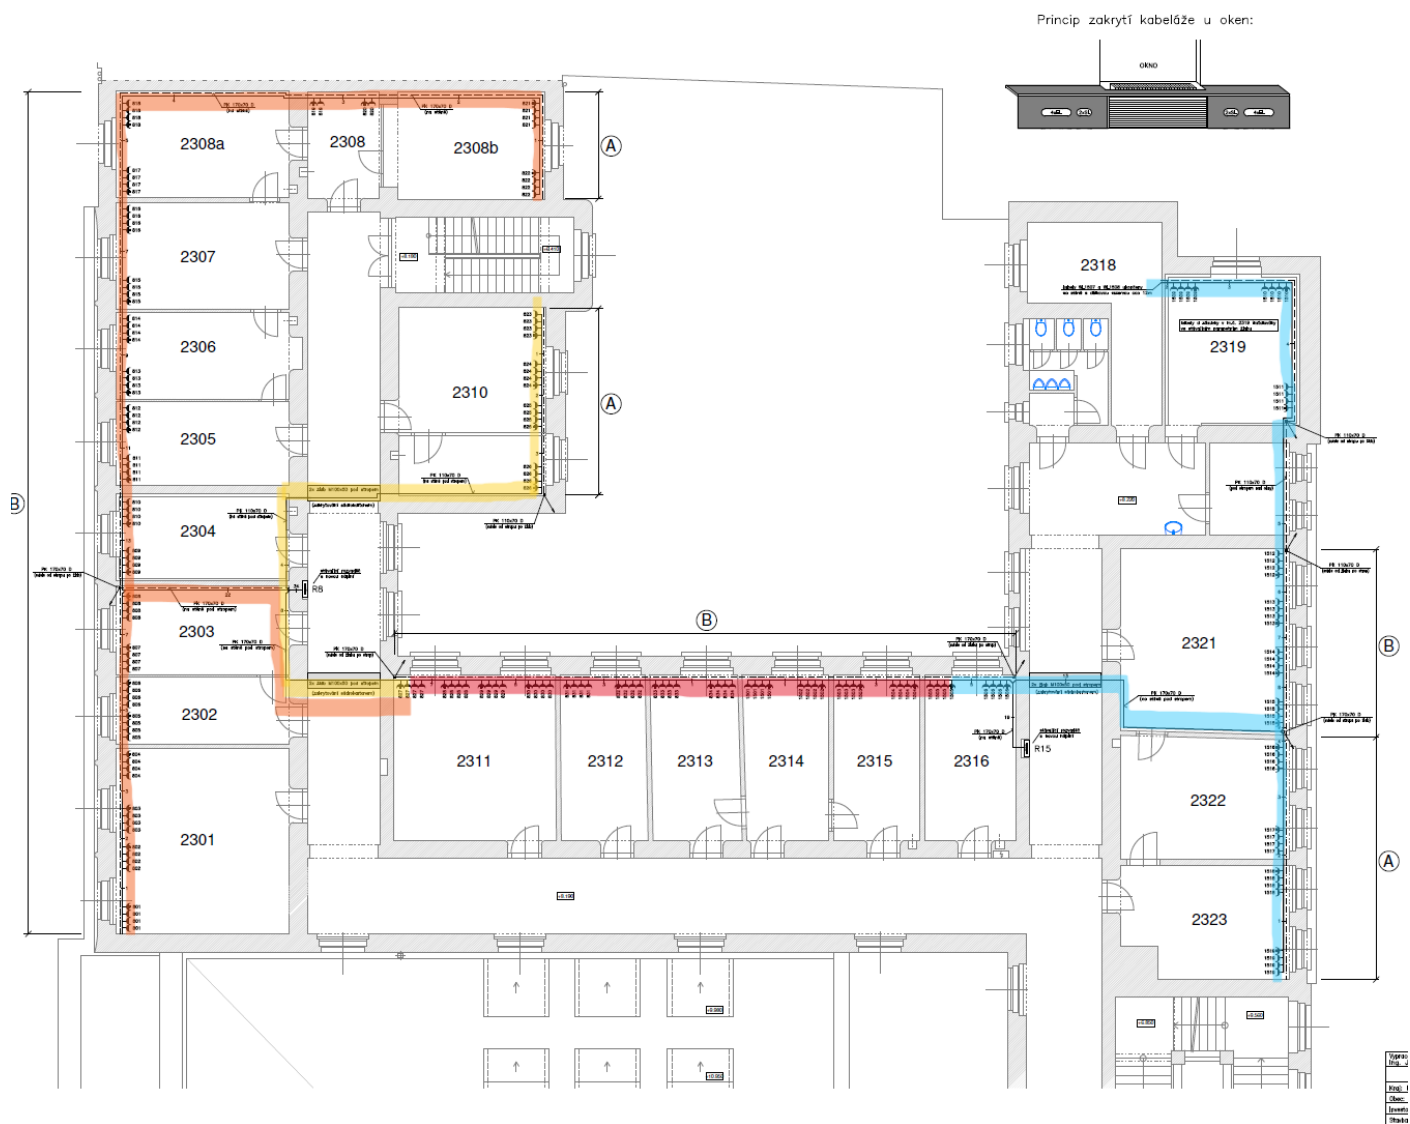

Etapa 6: 4. patro „zákoutí“ pod „věží“ do místnosti 2416

- dotčených 14 kanceláří
- z hlediska vystěhování kanceláří lze rozdělit na několik podetap (označeno barevně)
- 2403 a 2404 trasa pod stropem
- 2404 kabelové rezervy – uložení

