


2. Vymezení úseku

Celková délka sledovaného úseku silnice II/315 je 7252 m.

Začátek úseku (km 26,330 provozního stančení) je v místě křižovatky se silnicí I/14 v Ústí nad Orlicí.

Konec úseku (km 33,582 provozního stančení) je před křižovatkou se silnicí III/31512 v obci Skuhrov.

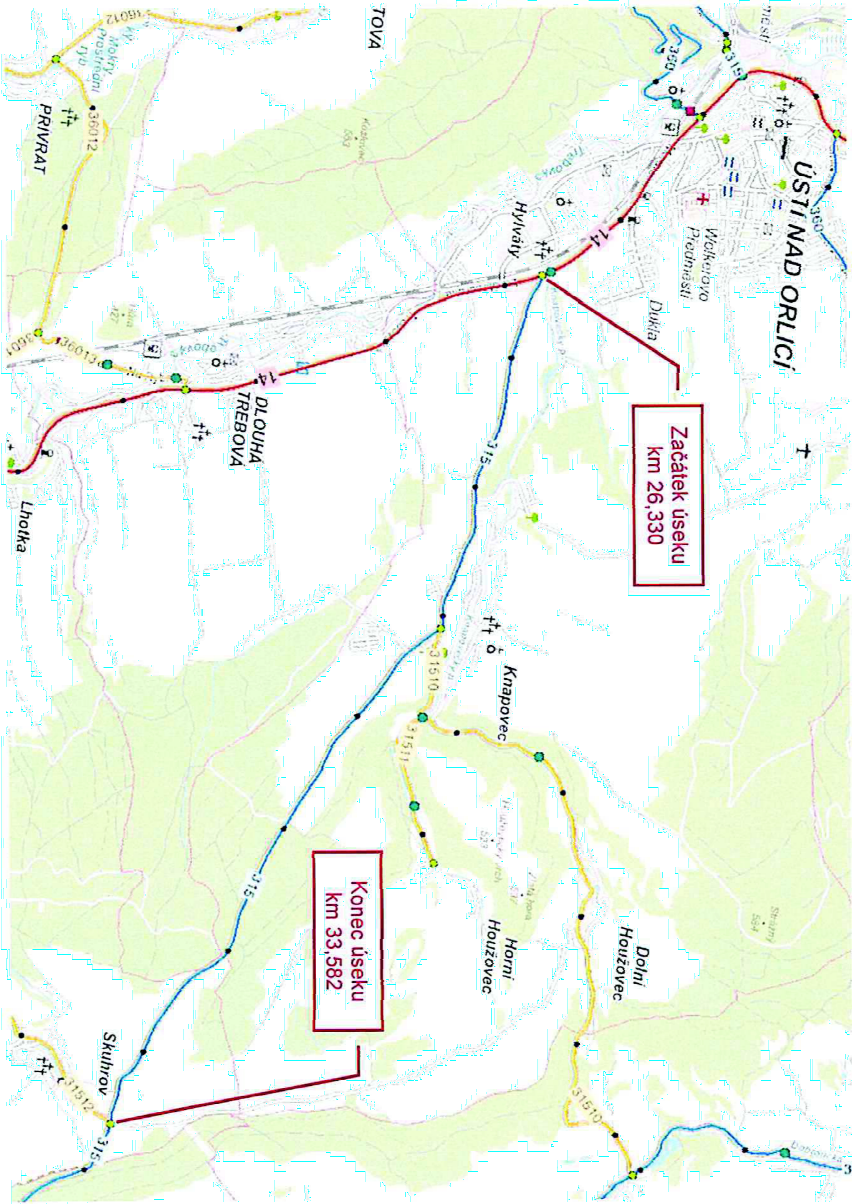

LEGENDA ETAPY REALIZACE MODERNIZACE SILNICE II/315

- 1. ETAPA**
SO 101, SO 102, SO 105 km 0,0 - 2,75
ÚPLNÁ UZAVÍRKA od křižovatky I/14 po křižovatku III/31510 Knapovec
- 2. ETAPA**
SO 103, SO 104 km 2,75 - 7,252
ÚPLNÁ UZAVÍRKA od křižovatky III/31510 Knapovec po křižovatku III/31512 Skuhrov

LEGENDA OBJÍZDNÁ TRASA

- obě etapy všechna vozidla včetně linkových autobusů na trase Ústí-Lanškroun
Ústí - I/14 - Česká Třebová - Třebovice - I/43 Lanškroun
1. etapa jen linkové autobusy, které zajiždějí do Knapovce (zast. Knapovec, SZP na sil. III/31510) a do Houžovce
Ústí - I/14 Dlouhá Třebová - ÚK - Knapovec - III/31510 - Dolní Houžovec

AUTORIZACE		ČÍSLO PŘÍLOHY	
ČÍSLO ZMĚNY	DATUM ZMĚNY	POPIS/OBSAH ZMĚNY	PODPIS

Modernizace silnice II/315 Ústí nad Orlicí (od křižovatky s I/14) - Skuhrov (včetně Skuhrova)

název akce

stavební objekt

Pardubický kraj Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice objednatel	spolupráce
k.ú.Hyňavá, Knapovec, H. Houžovec, Skuhrov u ČT místo stavby	PARDUBICKÝ kraj

DOPRAVNÉ INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ
Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové
tel : 495 219 036, 495 212 647, fax : 495 221 677
e-mail : dlk@dlk-hk.cz, [http : www.dlk-hk.cz](http://www.dlk-hk.cz)

PŘEHLEDNÁ SITUACE, ETAPIZACE VÝSTAVBY A OBJÍZDNÉ TRASY		mřítko		PDPs
výkres				stupeň

ING. M. BURIANEC		ING. M. BURIANEC	A067/20	B.1
kontroval		hlavní inženýr projektu	číslo zakázky	
ING. JIŘÍ ELIÁŠEK		ING. M. BURIANEC	6/2020	datum
zodpovědný projektant		vedoucí projektant		číslo přílohy
