


SITUACE - POSTUP PRACÍ PŘELOŽKY KABELU VN A STL PLYNOVODU
1:1000

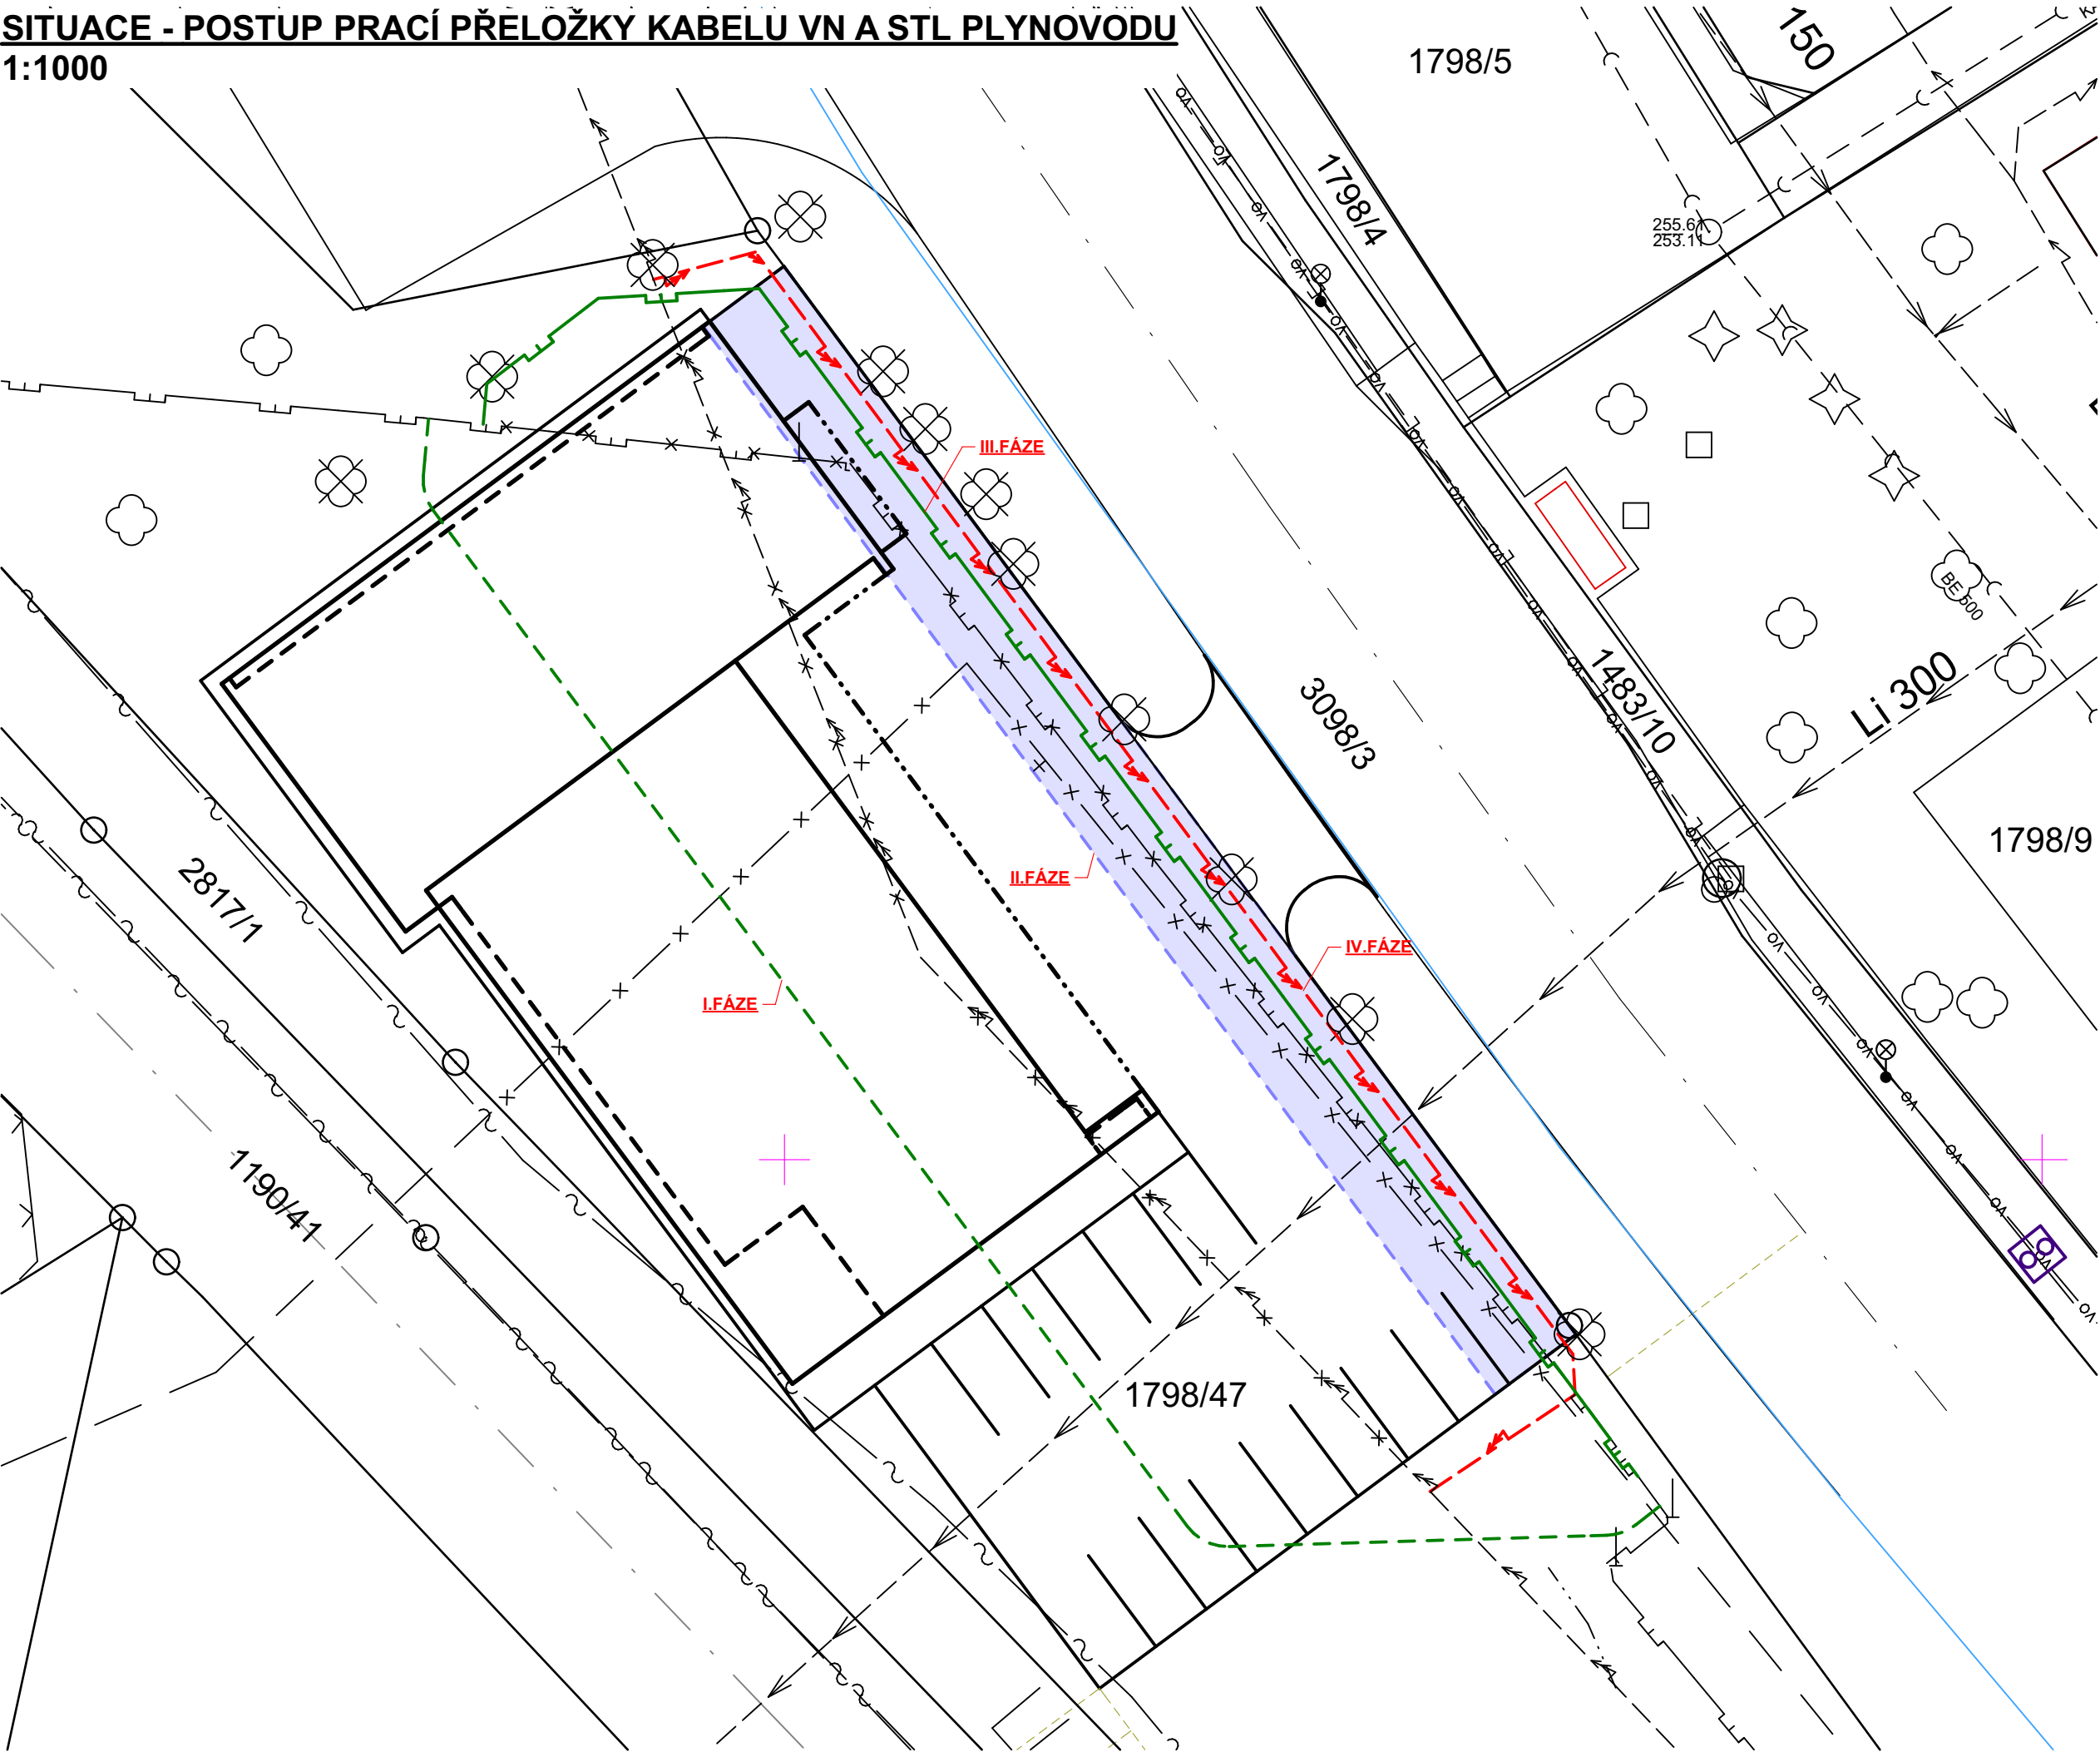

LEGENDA:

- I. FÁZE STAVBY:**
- PROVEDENÍ PROVIZORNÍHO OBTOKU STL PLYNOVODU
- II. FÁZE STAVBY:**
- PROVEDENÍ HTÚ V PRUHU ŠÍROKÉM cca 4,0m
- výměna zeminy v tl. 1,0m pod úroveň sejmutí ornice viz D1-02 Komunikace a zpevněné plochy
- včetně odstranění stávajícího potrubí STL plynovodu a sdělovacího kabelu
- PROVEDENÍ DO ÚROVNĚ KONSTRUKČNÍCH VRSTEV KOMUNIKACÍ
- viz D1-02 Komunikace a zpevněné plochy
- III. FÁZE STAVBY:**
- PROVEDENÍ PŘELOŽKY STL PLYNOVODU
- dobu realizace přeložky naplánovat mimo topné období o víkendů a s min. měsíčním předstihem projednat s dotčenou firmou Bramac a Evona (odběratelé v kategorii SO)
- IV. FÁZE STAVBY:**
- PROVEDENÍ PŘELOŽKY VEDENÍ VN
- provede provozovatel ČEZ Distribuce a.s. na základě smlouvy o realizaci přeložky
- předpokládaný termín zahájení prací provozovatelem 9.7.2018

Polohový systém S-JTSK, Výškový systém Bpv

Název stavby:				VÝSTAVBANOVÉ VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS PAK V CHRUDIMI							
Místo stavby:				k.ú. Chrudim, ulice Dr. Milady Horákové, p.č. 1798/47, 1798/4, 1798/5, 3098/3, 2817/1, 1483/10							
Objednatel:				Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje, Průmyslova 450, 530 03 Pardubice							
Generální projektant:		APOLO CZ s.r.o., Tyršova 155, 572 01 Polička		<div><div>APOLO CZ s.r.o. Tyršova 155, 572 01 Polička + 420 461 722 204 apoloc@apoloc.cz www.apoloc.cz</div></div>		Autorizační razítko: <div></div>					
Autor návrhu: Ing. arch. Karel Šrámek											
HIP: Miroslav Stejskal											
Projektant: Miroslav Stejskal											
Zodp. projektant:		Ing. Martin Kozáček									
Kraj:		Pardubický		Formát		3 A4		Číslo zakázky:		P0516	
Stav. úřad:		Chrudim		Revize:		00		Datum		03/2017	
Stupeň PD:				DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY							
Část:				C - SITUACE STAVBY							
Obsah přílohy:				SITUACE - POSTUP PRACÍ PŘELOŽKY KABELU VN A STL PLYNOVODU							
				Označení přílohy:				C.05			
				Číslo paré:							
				Měřítko:				1:250			
