PŘÍČNÝ ŘEZ

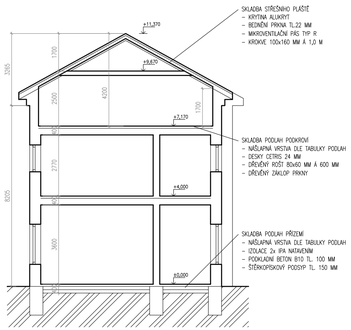

POHLED ZÁPADNÍ

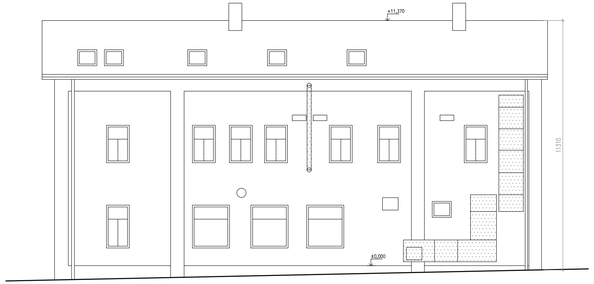

POHLED SEVERNÍ



POHLED JIŽNÍ

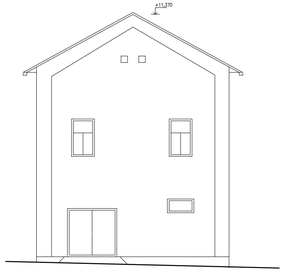

POHLED SEVERNÍ

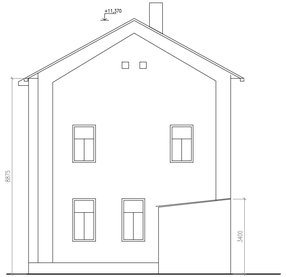

POHLED VÝCHODNÍ

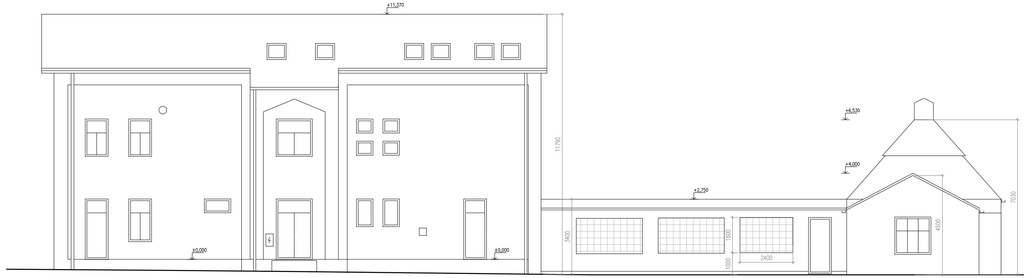

POSTUP BOURACÍCH PRACÍ.

1. Vyklízení interiérového vybavení (nábytek, kuch. linky, recepční pulty, obrazy, reklamní a informační cedulky, zrcadla, vybavení hyg. zázemí a podobně)
2. Příprava bouracích prací - vymezení transportních koridorů, bezpečnostních pásem, plánků a tabulek okolo bouraného objektu. Příprava pro odvoz stavební suti, zařízení staveniště, oplocení, ostatní příprava bouracích prací.
3. Odstranění povrchových materiálů (např. koberce, akustické a architektonické obklady)
4. Odpojení stavby od přípojek inženýrských sítí a jejich následná demontáž.
5. Odpojení jednotlivých částí od médií (Elektro, vodovod, vytápění/chlazení) a odstranění všech vnitřních montovaných konstrukcí (příčky a podhledy, zděných příček, sanity a konzových prvků ZTI a elektro(svítidla, zásuvky, vypínače). Dále demontáž parapetních konstrukcí, demontáž VZT prvků a tech. vedení.
6. Odstranění nebezpečných látek, např. azbest.
7. Odstranění a demontáž technického zařízení budovy.
8. Demontáž stojících konstrukcí pro zónování oddělovací příčky, pomocné konstrukce.
9. Postupné bourání stavby pomocí středně velkých mechanismů - postup bourání nosných konstrukcí je obecně popsán v dile statika v dokumentaci jednotlivých objektů - nutno respektovat! Stěny budou odstraněny včetně základových konstrukcí
10. Odvoz stavební suti - odklizení stavební suti a začištění stavební plochy (příprava pro realizaci stavebního objektu)

ROZVODY A ZAŘÍZENÍ SLOUŽÍCÍ SOUSEDNÍM OBJEKTŮM, KTERÉ ZŮSTÁVAJÍ V PROVOZU, MUSÍ BÝT ZACHOVÁNY A OCHRÁNĚNY.

- NA BOURACÍ PRÁCE BUDE VYPRACOVÁN TECHNOLOGICKÝ POSTUP DODAVATELE. I S OHLEDEM NA NAVAZUJÍCÍ FUNKČNÍ ČÁSTI NEMOCNICE SVITAVY
- BOURACÍ PRÁCE JE NUTNO PROVÁDĚT ZA STÁLÉ PŘÍTOMNOSTI ODBORNÉ ZPŮSOBILÉ OSOBY A ZÁSTUPCE INVESTORA PŘÍP. PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ
- BOURACÍ PRÁCE BUDOU PROVÁDĚNY TECHNOLOGIEMI SNIŽUJÍCÍ HLUK, PRAŠNOST A VIBRACE
- PŘED ZAPOČETÍM BOURACÍCH PRACÍ JE NUTNÉ ODPOJIT VEŠKERÉ ROZVODY INSTALACÍ A MÉDIÍ PROCHÁZEJÍCÍCH BOURANÝM PROSTOREM, A TO ZA ÚČASTI ZÁSTUPCE INVESTORA A BUDE O TOM PROVEDEN PŘESNÝ PROTOKOL
- PŘI BOURÁNÍ PŘÍČEK A PODLAHOVÝCH KONSTRUKCÍ JE NUTNO POSTUPOVAT TAK, ABY NEDOŠLO K POŠKOZENÍ NOSNÉ STROPNÍ KONSTRUKCE
- PŘI JAKÝCHKOLIV NEJASNOSTECH NEBO OKOLNOSTECH, KTERÉ SE BUDOU LIŠIT OD INFORMACÍ UVEDENÝCH V PD, JE NUTNÉ KONTAKTOVAT PROJEKTANTA!
- VEŠKERÝ VYBOURANÝ MATERIÁL SE BUDE PRŮBĚŽNĚ ODSTRAŇOVAT Z OBJEKTU, NESMÍ DOCHÁZET K JEHO HROMADĚNÍ A LOKÁLNÍMU PŘETĚŽOVÁNÍ KONSTRUKCE
- NEBEZPEČNÝCH MATERIÁLY BUDOU LIKVIDOVÁNY PŘEDEPSANÝM POSTUPY
- VEŠKERÉ BOURACÍ PRÁCE MUSÍ BÝT PROVÁDĚNY V SOULADU S NAŘÍZENÍM VLÁDY Č. 591/2006 SB., O BLIŽŠÍCH MINIMÁLNÍCH POŽADAVCÍCH NA BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ NA STAVENIŠTÍCH A S NÍ SOUVISEJÍCÍMI PŘEDPISY A DLE ZPRACOVANÉ DODAVATELSKÉ DOKUMENTACE POSTUPU A TECHNOLOGIE BOURÁNÍ, KTERÁ MUSÍ BÝT ODSOUHLASENA HLAVNÍM STATIKEM OBJEKTU
- PRACOVNÍCI MUSÍ BÝT VYBAVENI VŠEMI POTŘEBNÝMI PRACOVNÍMI POMŮCKAMI A PROSTŘEDKY

REV. | REV.	DATUM | DATE	POPIS | DESCRIPTION
00	01/06/2024	Popis revize 00

NÁZEV STAVBY | BUILDING

NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu

MÍSTO STAVBY | LOCATION

Svitavská nemocnice
Kollárova 7
568 25 Svitavy

INVESTOR | INVESTOR

Pardubický kraj
Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice

HLAVNÍ ARCHITEKT | HEAD ARCHITECT

Karlinblok, s.r.o.
Pernerova 659/31a
186 00, Praha 8
www.karlinblok.cz
hlavní architekt projektu
Ak. arch. Vladimír Kružík

HLAVNÍ PROJEKTANT | HEAD DESIGNER

Karlinblok, s.r.o.
Pernerova 659/31a
186 00, Praha 8
www.karlinblok.cz
hlavní inženýr projektu
Dalibor Stejskal

ZPRACOVATEL ČÁSTI | SUBCONTRACTOR

Karlinblok, s.r.o.
Pernerova 659/31a
186 00, Praha 8
číslo zakázky
24-340

AUTORIZACE | SEAL

VYPRACOVAL | DRAWN BY
Ing. Jitka Herrmanová
...
...

KONTROLOVAL | CHECKED BY
Ing. arch. Stanislav Šrot

ZODP. PROJEKTANT | RESPONS. DESIGNER
Dalibor Stejskal

STUPEŇ DOKUMENTACE | DESIGN STAGE — KÓD | CODE
DOKUMENTACE BOURACÍCH PRACÍ — **DBP**

ČÁST | SECTION
D DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU

OBJEKT (SO, PS) | BUILDING
SO02 OBJEKT C - PATOLOGIE

DÍL | PART
••• ...

PROFESNÍ DÍL | PROFESSION PART — KÓD | CODE

DĚLENÍ | DIVISION
••• ...

ČLENĚNÍ | STRUCTURE
••• ...

NÁZEV VÝKRESU | DRAWINGS NAME — KOPIE | COPY

PŘÍČNÝ ŘEZ + POHLEDY NA FASÁDY

DATUM | DATE OF ISSUE	MĚŘÍTKO | SCALE	FORMÁT | PAPER SIZE
30/4/2024	1:150	4x A4

ČÁST SECTION	SO / PS BUILDING	DÍL PART	PROF. DÍL PROF. PT	DĚLENÍ SECTION	ČLENĚNÍ STRUCT	Č. VÝKRESU DRAW NO.	Č. REVIZE REV NO.
D	02	...	...	...	...	104	00

NÁZEV SOUBORU | FILE NAME
D_SO 02_DEM_PAO.dwg

POLOHOPISNÝ SYSTÉM: **S-JTSK** VÝŠKOVÝ SYSTÉM: **Bpv** **±0,000 = 440,26 m.n.m.**
M 1/100 | 1m | 5m | 10m
