

Název úkolu	Zahájení	Dokončení
NIS IZS	1.3.2013	27.2.2015
Rámcový koncept SW řešení	1.3.2013	29.3.2013
Prováděcí koncept SW řešení	1.4.2013	31.10.2013
Funkční prototyp (FP)	1.3.2013	31.10.2013
Vybavení datových center	1.8.2013	30.4.2014
Vybavení operačních středisek	1.11.2013	30.4.2014
VZ Disková pole - rámcová smlouva, termín včetně dodávky 6týdnů	24.8.2013	1.1.2014
VZ Servery, Koncová prac.,IP tel., Nahrávání, Networking - rámcová smlouva, 6týdnů dodávka	18.11.2013	6.4.2014
VZ SW a ostatní - konkrétní dodávky bez RS, termín včetně dodávky 6týdnů	18.11.2013	6.4.2014
Pilotní instalace	1.11.2013	31.8.2014
Plošná instalace	1.5.2014	30.9.2014
Testování SW	1.11.2013	31.12.2014
Finalizace SW podle připomínek z testování	2.7.2014	31.12.2014
Zátěžové testy systému NIS IZS	1.10.2013	31.12.2014
Závěrečná převzetí SW a HW (systému NIS IZS)	1.2.2015	28.2.2015
Dodávka pro hlavní město Prahu	1.10.2014	28.2.2015

Legenda / komentář harmonogramu NIS IZS

Takto jsou označeny interní procesy ČP OZ



Takto jsou označeny společné procesy HZS a ČP OZ

ITS NGN	27.8.2013	12.1.2015
Zajištění zadávacího řízení (Schvalování Výzvy, uzavření smlouvy)	27.8.2013	31.1.2014
Cílový koncept implementace	1.11.2013	3.7.2014
Příprava projektového plánu migrací,návrhu podmínek a parametrů provozu,	4.7.2014	1.8.2014
Nákup ininstalace / migrace pasivní a aktivní infrastruktury ITS NGN	23.9.2013	24.12.2014
JŘBU místní šetření druhé přípojky páteře ITS (ČDT)	23.9.2013	28.2.2014
Zpracování návrhu ZD, formulářů apod. pro schválení OSF, MMR	23.9.2013	15.10.2013
Předložení MV, OSF, MMR k vyjádření	16.10.2013	15.11.2013
Výběrové řízení pro nákup fyzické vrstvy ITS pomocí DNS	18.11.2013	10.12.2014
Nákup aktivních prvků sítě IP/MPLS - ITS NGN	3.1.2014	8.5.2014
Nákup aktivních prvků DWDM ITS NGN	3.1.2014	8.5.2014
Migrace transportní vrstvy	15.5.2014	24.12.2014
Migrace IP/MPLS ICT NGN	15.5.2014	24.12.2014
Realizace testovacího prostředí	9.6.2014	9.1.2015
Akceptace projektu	12.1.2015	12.1.2015

Legenda / komentář

PK NIS definuje své finální požadavky pro ITS NGN (požadavky na přenosové pásmo)

Pilotní testování NIS bude probíhat na stávající ITS

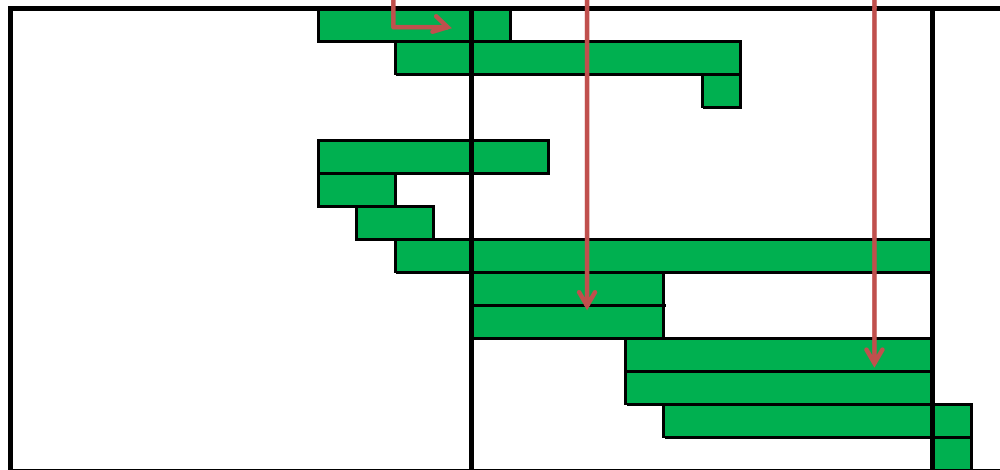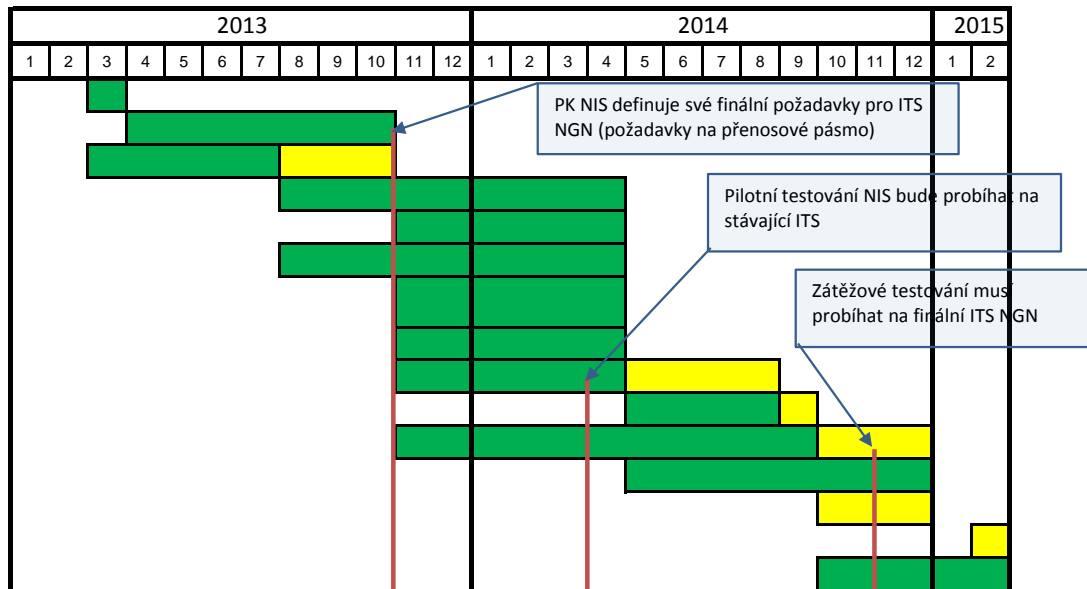

Název úkolu	Zahájení	Dokončení	2013	2014	2015
-------------	----------	-----------	------	------	------

Zátěžové testování musí probíhat na finální ITS NGN
