

Smlouva o dílo č. OR/15/24091

na

„Zhotovení projektové dokumentace na stavbu Modernizace silnice II/322 od křiž. s III/3224 po nový obchvat Kojic, včetně výkonu autorského dozoru projektanta“

Smluvní strany

1. Objednatel: **Pardubický kraj**
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
zastoupen: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmánem
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
Ing. Jiří Kunt, Ph. D. nebo Jaroslav Tomšů
Bankovní spojení: ČSOB Pardubice
č.ú. 220430336/0300
IČ: 70 89 28 22
DIČ: CZ 70892822 neplátce DPH
2. Zhotovitel: **HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.**
Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8
zastoupen: Ing. Václavem Starým
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Ing. Milan Ptáček
Bankovní spojení: ING Bank N.V.
č. ú.: 1000449603/3500
IČ: 45797170
DIČ: CZ45797170
spisová značka rejstříkového soudu: C 11622 vedená u
Městského soudu v Praze

uzavírají tuto smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí, provést pro objednatele dílo dle podmínek této smlouvy a jejích příloh a objednatel se zavazuje za podmínek této smlouvy dílo převzít a zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho provedení.

Článek I. **Předmět díla**

1. Zhotovitel se zavazuje za podmínek této smlouvy v rozsahu projektového záměru předmětné stavby pro objednatele zpracovat
 - a. dokumentaci pro podání žádosti o vydání územního rozhodnutí na stavbu „Zhotovení projektové dokumentace na stavbu Modernizace silnice II/322 od křiž. s III/3224 po nový obchvat Kojic, včetně výkonu autorského dozoru projektanta“ v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb. o územním

plánování a stavebním řádu a prováděcích vyhlášek, zejména vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu. Součástí dokumentace je zakreslení stavby do katastrální mapy, návrh oddělovacího geometrického plánu včetně souhlasu stavebního úřadu s dělením pozemků, výpisy dotčených pozemků z katastru nemovitostí, záborový elaborát, stanovení odvodů za zábor zemědělského a lesního půdního fondu, obstarání souhlasů, popř. stanovisek vlastníků pozemků k záborům a věcným břemenům, obstarání rozhodnutí dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, obstarání závazných stanovisek a obstarání stanovisek vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury a jejich zapracování do čístopisu a sepsání žádosti o vydání územního rozhodnutí tak, aby mohlo být vydáno pravomocné územní rozhodnutí. Objednatel je povinen bez jakéhokoliv odkladu předat zhotoviteli vydané územní rozhodnutí k porovnání věcných údajů uvedených v žádosti o vydání územního rozhodnutí s údaji uvedenými ve vydaném rozhodnutí. V případě zjištění rozdílných údajů mezi výše uvedenými podklady a vydaným rozhodnutím musí zhotovitel v termínu před nabytím právní moci rozhodnutí o této skutečnosti informovat objednatele a příslušný stavební úřad.

- b. projektovou dokumentaci na stavbu „**Zhotovení projektové dokumentace na stavbu Modernizace silnice II/322 od křiž. s III/3224 po nový obchvat Kojic, včetně výkonu autorského dozoru projektanta**“ pro podání žádosti o vydání stavebního povolení v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu a prováděcích vyhlášek. Dále bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb. Objednatel je povinen bez jakéhokoliv odkladu předat zhotoviteli vydané stavební povolení k porovnání věcných údajů uvedených v žádosti o vydání stavebního povolení s údaji uvedenými ve vydaném rozhodnutí. V případě zjištění rozdílných údajů mezi výše uvedenými podklady a vydaným rozhodnutím musí zhotovitel v termínu před nabytím právní moci rozhodnutí o této skutečnosti informovat objednatele a příslušný stavební úřad.
- c. zadávací dokumentaci – dokumentaci pro provádění stavby na stavbu „**Zhotovení projektové dokumentace na stavbu Modernizace silnice II/322 od křiž. s III/3224 po nový obchvat Kojic, včetně výkonu autorského dozoru projektanta**“, která bude zpracována do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky pro realizaci stavby dle § 44 – 46 a 47 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Je tedy požadován stupeň projektové dokumentace pro provádění stavby vč. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem – vyhl. č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění. Není-li to odůvodněno předmětem veřejné zakázky, nesmí zadávací dokumentace obsahovat obchodní firmy, názvy, nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo

vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků. Projektová dokumentace bude zpracována dle vyhl. č. 146/2008 Sb.

Projektová dokumentace bude obsahovat u jednotlivých stavebních objektů kód CPV, CZ-CPA a CZ-CC. Paré č. 1 a 2 bude obsahovat oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr dle vyhl. č. 230/2012 Sb. ve znění platném v době dokončení dokumentace. Použitá cenová úroveň bude v komentáři uvedena. Ceny budou uvedeny bez DPH, u všech položek bude stanovena sazba DPH a uvedena cena včetně DPH. Součástí projektové dokumentace bude plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi zpracovaný s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdravé neohrožující práce a projekt ZOV. Součástí projektu ZOV bude i POV s návrhem harmonogramu prací zhotovitele stavby během částečných a úplných uzavírek komunikace. V harmonogramu musí být uvedeny i nezbytné technologické přestávky a musí být navržen tak, aby průběžná lhůta výstavby během uzavírek komunikací byla minimální a nedocházelo ke zbytečným přestávkám při realizaci prací. Tento harmonogram bude pro dodavatele stavby závazný. Všechny uzavírky a objízdné trasy musí být projednány s dotčenými účastníky následného řízení ve věci uzavírek silnic. Doklady o projednání s těmito účastníky musí být součástí dokladové části zadávací dokumentace.

2. Součástí díla je provedení všech potřebných průzkumných prací, které jsou nezbytné pro zpracování projektové dokumentace a řádné provedení projektovaného díla. Součástí díla bude též dokumentace o provedeném diagnostickém průzkumu. Před zahájením projekčních prací svolá zhotovitel vstupní jednání s objednatelem, na kterém bude upřesněn další postup a stanoveny termíny dalších jednání.
3. V závěru prací na dokumentaci svolá zhotovitel jednání, na kterém seznámí objednatele s rozpracovanou dokumentací. V závěru prací je zhotovitel dále povinen zajistit odborné posouzení Východočeského muzea v Pardubicích k předpokládanému výskytu archeologických situací a nálezů v místě plánované stavby. Kontaktní osobou pro tyto účely je PhDr. Jan Jílek Ph.D., e-mail: jilek@vcm.cz.

V závěru prací na dokumentaci svolá zhotovitel jednání, na kterém seznámí objednatele s rozpracovanou dokumentací. Rozpracovaná dokumentace bude projednána v dokumentačním výboru, který se koná každou první středu každého kalendářního měsíce v zasedací místnosti ředitelství SUS Pk v Doubravících. V odůvodněných případech na požádání zhotovitele bude dokumentační výbor svolán v jiném termínu. Součástí předmětu plnění této smlouvy je i zapracování připomínek objednatele do dokumentace. Bez výstupního protokolu dokumentačního výboru nebude projekt akceptován - platí pro dopravní stavby.

4. Dokladová část dokumentace bude obsahovat zápisy ze všech jednání uskutečněných mezi objednatelem a zhotovitelem v průběhu plnění díla.

Součástí dokladové části bude i souhlasné stanovisko budoucího uživatele s projektovou dokumentací.

5. Zhotovitel zpracuje a předá objednateli dílo v písemné formě v českém jazyce. Počet vyhotovení je 8 paré tištěné formy projektové dokumentace pro územní rozhodnutí, 10 paré tištěné formy projektové dokumentace pro stavební povolení a 10 paré tištěné formy zadávací dokumentace – dokumentace pro provádění stavby. Dále bude dílo zároveň předáno 5x v digitální formě na nosiči CD nebo DVD ve formátu MS WORD, výkresová část v AUTOCAD formát DWG a současně ve formátu PDF, tabulky budou ve formátu MS EXCEL. Oceněný a neoceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem, vyhl. č. 230/2012 Sb., bude předán ve formátu XLS a tištěné podobě autorizované. Dále předá zhotovitel objednateli zadávací dokumentaci – dokumentaci pro provádění stavby v digitální formě v komprimovaném formátu WinZIP, přičemž jednotlivé soubory komprimovaného formátu nesmí přesáhnout datovou velikost 45 MB. V případě potřeby dalších vícetisků se zhotovitel zavazuje tyto vícetisky zhotovit bezplatně pouze za cenu nákladů na zhotovení kopií za ceny obvyklé v PLG centrech včetně kompletace. Celková situace stavby bude v systému JTSK, Balt po vyrovnání. Všechna paré budou řádně autorizována. Jedno paré bude obsahovat originály dokumentů.

Článek II.

Cena díla, platební a fakturační podmínky

1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo činí celkem:

285.000,- Kč (Slovy: dvěstěosumdesátpěttisíc korun českých) bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

DPH činí **59.850 Kč** (Slovy: padesádevěttisícsumsetpadesát korun českých).

Cena včetně DPH činí **344.850,- Kč** (Slovy: třistačtyřicetčtyřtisícsumsetpadesát korun českých).

Z toho:

- cena včetně DPH za předmět díla uvedený v čl. I bod 1. písm. a) činí **155.182,50 Kč** (Slovy: stopadesátpěttisícstoosumdesátdva korun českých a padesát haléřů).

- cena včetně DPH za předmět díla uvedený v čl. I bod 1. písm. b) činí **120.697,50 Kč** (Slovy: stodvacettisícšestsetdevadesátsedum korun českých a padesát haléřů).

- cena včetně DPH za předmět díla uvedený v čl. I bod 1. písm. c) činí **68.970,- Kč** (Slovy: šedesátosumtisícdevětsetsedumdesát korun českých).

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré dodávky, služby, práce a náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním díla popsaného v této smlouvě (mimo vyžádaných vícetisků). Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.

2. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou cenu díla uvedenou v bodě 1. tohoto článku na základě jeho faktur a na základě předávacích protokolů v souladu s dalšími podmínkami uvedenými v této smlouvě.
3. Právo zhotovitele na fakturaci, včetně fakturace DPH, vzniká dnem podepsání protokolu o předání a převzetí předmětu díla oběma smluvními stranami. Nedílnou součástí předávacího protokolu bude i formulář dle přílohy č. 2 této smlouvy. Kopie uvedeného protokolu bude přílohou faktury.
4. Faktura bude adresována:
Pardubický kraj
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
5. Faktura bude splňovat náležitosti daňového dokladu v souladu s právními předpisy a zvyklostmi (včetně správně uvedeného názvu, sídla a čísla smlouvy objednatele). Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli bez zaplacení fakturu, která nemá náležitosti uvedené v tomto ustanovení nebo vykazuje jiné vady. Současně s vrácením faktury sdělí objednatel zhotoviteli důvody vrácení. V závislosti na povaze vady je zhotovitel povinen fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti faktury. Nová lhůta splatnosti začíná běžet ode dne doručení objednateli doplněné, opravené nebo nově vyhotovené faktury s příslušnými náležitostmi, splňující podmínky této smlouvy.
6. Faktury jsou splatné do 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení faktury objednateli.
7. Úhradou se rozumí odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

Článek III. **Termín plnění**

1. Zhotovitel se zavazuje řádně dokončené dílo dle čl. I. této smlouvy předat objednateli v těchto termínech:
 - předmět díla uvedený v čl. I bod 1. písm. a) nejdéle do **120 dnů od podpisu smlouvy**
 - předmět díla uvedený v čl. I bod 1. písm. b) nejdéle do **60 dnů od vydání pravomocného územního rozhodnutí**
 - předmět díla uvedený v čl. I bod 1. písm. c) nejdéle do **60 dnů od vydání pravomocného stavebního povolení**

Článek IV. Provádění díla

1. Zhotovitel bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce a služby, které jsou předmětem této smlouvy, zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo kompletní dílo odpovídající podmínkám stanoveným touto smlouvou a účelu použití.
2. Zhotovitel je povinen dílo provést ve sjednané době a v souladu s dalšími podmínkami stanovenými touto smlouvou. Zhotovitel se zavazuje zajistit v rámci provádění díla úplné a včasné provedení všech prací nutných pro řádné dokončení díla bez vad a další plnění, jejichž provedení je pro řádné a včasné dokončení díla nezbytné.
3. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré předpisy, pokud se vztahují k prováděnému dílu. Pokud porušením těchto předpisů zhotovitelem vznikne škoda, nese náklady zhotovitel.
4. Předmět díla musí vyhovovat technickým a právním normám a ostatním předpisům platným v České republice a bude obsahovat veškeré části, vyžádané stavebním úřadem a zainteresovanými orgány.
5. Zhotovitel prohlašuje, že mu jsou známy technické, kvalitativní a specifické podmínky za nichž se má dílo realizovat.
6. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
7. Zhotovitel se zavazuje k uchování této Smlouvy o dílo včetně jejích případných dodatků, veškerých originálů účetních a daňových dokladů, originálů projektové dokumentace a dalších dokumentů souvisejících s přípravou tohoto projektu v souladu s dobou stanovenou právními předpisy ČR, nejméně však 10 let od ukončení projektu. Zhotovitel se zavazuje, že umožní neustálou dostupnost dokladů projektu pro účely příslušných kontrol a všem subjektům provádějícím kontrolu případně audit tohoto projektu poskytnout potřebné informace týkajících se dodavatelských činností v souladu s pravidly příslušného operačního programu IROP.
8. Zhotovitel se bude při plnění předmětu díla dále řídit podmínkami uvedenými v platné verzi Příručky pro žadatele a příjemce a v konkrétní výzvě operačního programu IROP „Vybrané úseky silnic II. a III. třídy“, Prioritní osa 1. Konkurenceschopné dostupné a bezpečné regiony, Oblast podpory 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítě regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T, která je uvedena na webových stránkách <http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Uvodni-strana>
<http://www.rada-severovychod.cz/irop>

Konkrétní specifikace a způsob splnění těchto podmínek v rámci zpracování projektové dokumentace v souladu s čl. I., bod 1. smlouvy bude, z hlediska uznatelných výdajů v rámci příslušného operačního programu IROP, nedílnou součástí projednávaných bodů na 1. technické radě se zhotovitelem

Článek V. **Průběžná kontrola**

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím pověřených osob.
2. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen průběžně jej informovat o stavu rozpracovaného díla, předkládat mu dílčí výsledky a rozpracovanou dokumentaci s ním konzultovat.

Článek VI. **Záruky, odpovědnost za vady**

1. Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu díla, provedení prací uvedených v čl. I. této smlouvy podle této smlouvy a souvisejících platných předpisů. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost za škody způsobené případnými technickými nebo jinými nedostatky předané dokumentace. Zhotovitel odpovídá za správnost, úplnost a proveditelnost dokumentace. Statické a dynamické výpočty musí být zpracovány v takové formě, aby byly kontrolovatelné, zejména v tom směru, aby bylo možno posoudit uvažované zatížení konstrukcí, zvolené výpočtové metody a formu výstupů. Zhotovitel dále odpovídá za to, že řešení díla je navrženo s přihlédnutím k objednatelům stanovenému účelu ekonomicky přiměřeně.
2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že celé dílo (a každá jeho část) bude prosto jakýchkoliv vad, zj. věcných, právních i ostatních ke dni předání díla. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže zejména neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, objednatel, platnými předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé.
3. Zhotovitel poskytuje po uvedené záruční dobu záruku za bezvadnost předmětu díla, tj. záruku za všechny vlastnosti, které má mít předmět díla zejména dle této smlouvy, dle jednotlivých požadavků a pokynů objednatele, případně ostatních pověřených osob, dle norem a ostatních předpisů, pokud se na prováděný předmět díla či jeho části vztahují. Zhotovitel prohlašuje, že předmět díla si po tuto dobu zachová všechny takové vlastnosti, funkčnost a stanovenou účelovou způsobilost. Po dobu záruční doby je tedy rozsah záruky neomezený, což znamená zejména, že předmět díla provedený podle této smlouvy bude prostý jakýchkoliv vad.

4. Zhotovitel odpovídá za vady díla uvedené v bodě 1., 2. a 3. tohoto článku této smlouvy, které budou zjištěny v záruční době. Záruční doba činí 60 měsíců ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí předmětu díla oběma smluvními stranami.
5. Vada na díle, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude objednatelem oznámena bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli a tento odstraní závadu neprodleně, nejpozději však odstraní závadu ve lhůtě 10 pracovních dnů, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak.
6. Zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu činnost a dodá znovu části díla v míře potřebné k odstranění vad zjištěných objednatelem během záruční doby.
7. Zhotovitel je povinen vadu odstranit na vlastní náklady; to neplatí, pokud zhotovitel prokáže, že vadu nezavinil.
8. Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve lhůtě podle bodu 5. tohoto článku této smlouvy nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může objednatel odstoupit od smlouvy, požadovat přiměřenou slevu z ceny díla nebo po předchozím vyrozumění zhotovitele vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a sice na náklady zhotovitele, aniž by tím objednatel omezil jakákoliv svá práva daná mu touto smlouvou. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli výdaje a ušlý zisk, které souvisejí s odstraňováním vad zajišťovaným objednatelem, a to do 30 dnů po obdržení příslušného platebního dokladu objednatele.
9. V případě, že se jedná o vady, které brání užití díla k sjednanému účelu, může objednatel od smlouvy odstoupit.
10. V případě odstranění vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady užíváno vůbec nebo mohlo být užíváno jen v rozsahu nižším než dle této smlouvy.
11. Nároky z vadného plnění lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i výzva k odstranění vad odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
12. V případě odpovědnosti zhotovitele za vady platí v ostatním § 2615 a násl. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

Článek VII.

Zajištění plnění povinností

V případě porušení povinností daných zhotoviteli touto smlouvou má objednatel nárok, aniž by tím omezil svá ostatní práva vyplývající z této smlouvy, včetně práva na náhradu škody, vůči zhotoviteli uplatnit a zhotovitel má povinnost zaplatit smluvní pokutu. Povinnosti podléhající smluvní pokutě, podmínky a výše

smluvní pokuty jsou, kromě ostatních ujednání o smluvních pokutách výslovně uvedených na jiných místech této smlouvy, následující:

1. Dojde-li k prokazatelnému navýšení ceny díla stavby realizované na základě projektové dokumentace vypracované dle této smlouvy, a to z důvodu jakýchkoliv vad této projektové dokumentace (např. nesouladu mezi soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a projektovou dokumentací), je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10% z ceny díla za zpracování dokumentace pro provedení stavby (v případě navýšení do 5% smluvní ceny díla stavby); ve výši 20% z ceny díla za zpracování dokumentace pro provedení stavby (v případě navýšení od 5% do 10% smluvní ceny díla stavby); ve výši 30% z ceny díla za zpracování dokumentace pro provedení stavby (v případě navýšení větším než 10% smluvní ceny díla stavby).
2. V případě, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“) zjistí během zadávacího řízení realizovaného na základě projektové dokumentace vypracované na základě této smlouvy pochybení zadavatele v důsledku chybně zpracované projektové dokumentace stavby nebo soupisu stavebních prací vč. výkazu výměr, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli náklady na správní řízení vedené ÚOHS, včetně případných sankcí z něj vyplývajících vůči objednateli. Dále je zhotovitel povinen zaplatit objednateli škodu, která mu tímto vznikla.

V případě, že zhotovitel nedodrží povinnosti stanovené v čl.II bod 1. této smlouvy a objednatel v důsledku porušení těchto povinností bude sankcionován v řízeních týkajících se díla realizovaného na základě projektové dokumentace vypracované v souladu s touto smlouvou, a to formou krácení nebo úplného odejmutí poskytnuté dotace, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši této sankce.
3. V případě, že objednatel při kontrole projektové dokumentace a oceněného soupisu stavebních prací s výkazem výměrem zjistí podstatné nedostatky spočívající zejména v nesprávném stanovení počtu měrných jednotek nebo jednotkových cen, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli náklady prokazatelně vynaložené na porovnání zhotovitelem vytvořené projektové dokumentace a soupisu stavebních prací s výkazem výměr. Tyto náklady má objednatel právo odečíst od částky uvedené na faktuře zhotovitele, je-li to možné.
4. Bude-li zhotovitel v prodlení s předáním jakékoliv části řádně dokončeného díla dle čl. III. této smlouvy, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli za každý den prodlení smluvní pokutu ve výši 1 % ze smluvní ceny uvedené v bodu 1. článku II. této smlouvy s tím, že tuto smluvní pokutu má právo objednatel odečíst od částky uvedené ve faktuře zhotovitele.
6. Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve lhůtě podle bodu 5. článku VI. této smlouvy, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.
7. Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu podle této smlouvy na účet objednatele do 15 dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, započítat své finanční nároky vůči zhotoviteli.

8. Zaplacením smluvní pokuty zhotovitelem není dotčen nárok objednatele na náhradu případných škod vzniklých prodlením či vadným plněním zhotovitele.
9. Pokud není v ostatních ustanoveních smlouvy uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty zhotovitelem objednateli nezavazuje zhotovitele závazku splnit povinnosti dané mu touto smlouvou
10. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze strany objednatele.
11. Celková výše smluvních pokut, které mohou být zaplacený zhotovitelem, je omezena částkou 20 % ze smluvní ceny (není-li stanovena cena díla, pak z předpokládané ceny) díla realizovaného na základě projektové dokumentace vypracované v souladu s touto smlouvou.

Článek VIII. **Odstoupení od smlouvy**

1. Smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy.
2. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy zhotovitelem, kterým kromě případů odstoupení objednatele výslovně uvedených v ostatních článcích této smlouvy je, když:
 - a) I přes opakovaná upozornění objednatele zhotovitel brání nebo jinak znemožní provádění kontrol díla nebo jeho části.
 - b) Zhotovitel se přes opakované upozornění objednatelem zpozdil o více než 30 dnů s plněním jakékoliv ze svých povinností (zejména nedodržel termín předání dokončeného díla uvedený v článku III. této smlouvy) stanovených touto smlouvou, pokud pro danou povinnost tato smlouva výslovně nestanoví jinak.
 - c) Zhotovitel opakovaně nerealizuje dílo podle smlouvy nebo opakovaně zanedbává realizaci svých povinností daných smlouvou.
 - d) Zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není schopen obstarat potřebné věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení díla v souladu se smlouvou.
 - e) Zhotovitel je v insolvenčním řízení a bylo rozhodnuto o jeho úpadku nebo je v likvidaci.

V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je objednatel oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby dílo nebo jeho část dokončit, případně opravit nebo jinak uvést do souladu s podmínkami smlouvy. V takovém případě všechny náklady převyšující cenu

díla dle této smlouvy spojené s dokončením nebo uvedením díla či jeho části do souladu se smlouvou uhradí zhotovitel na účet objednatele do 30 dnů po obdržení platebního dokladu objednatele. Objednatel je oprávněn odečíst ze svých finančních závazků vůči zhotoviteli své finanční nároky na úhradu výše uvedených nákladů, které zhotoviteli účtuje.

3. Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy v případě, že nebude mít finanční prostředky pro pokračování realizace díla. V tomto případě má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla.
4. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy objednatelem, kterým kromě případů odstoupení zhotovitele výslovně uvedených v ostatních člancích této smlouvy je, když:

Objednatel se přes opakovaná upozornění zpozdil o více než 45 dnů s úhradou faktury, kterou přijal a nevrátil v souladu s článkem II. a ostatními podmínkami této smlouvy. V případě zpoždění uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení v zákonem stanovené výši.

5. V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy zhotovitelem nemá zhotovitel nárok na zaplacení ceny podle článku II. této smlouvy, a to ani na její poměrnou část, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. Zhotovitel je pouze oprávněn žádat po objednateli to, o co se objednatel zhotovováním předmětu díla obohatil. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok objednatele na náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty.
6. V případě odstoupení zhotovitele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy objednatelem má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok zhotovitele na náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty.

Článek IX.

Přechod vlastnického práva

Vlastnické právo k předmětu díla přechází ze zhotovitele na objednatele dnem podpisu protokolu o předání a převzetí předmětu díla oběma smluvními stranami.

Článek X.

Předání a převzetí předmětu díla

1. Předmět díla bude předán objednateli v dohodnutém místě, kterým je: Pardubický kraj, Komenského nám. 120, 532 11 Pardubice, budova C, OMSŘI kancelář číslo 334.

2. Zhotovitel je povinen včas objednatele vyzvat k převzetí předmětu díla. Důkazní břemeno prokazující vyzvání objednatele k převzetí předmětu díla a prokazující včasnost takové výzvy nese zhotovitel
3. Předmět díla je považován za řádně provedený tehdy, došlo-li k včasnému plnění bez vad a nedodělků a došlo-li k předání předmětu díla objednateli v místě plnění
4. Objednatel je povinen převzít pouze řádně (bezvadně) provedený předmět díla. O předání a převzetí předmětu díla se sepíše protokol o předání a převzetí předmětu díla, který podepíší obě smluvní strany. Jestliže objednatel odmítnul předmět díla převzít, neboť při převzetí zjistil, že předmět díla nebyl proveden řádně, protokol o předání a převzetí díla nepodepíše, ale pouze zaznamená důvody odmítnutí převzetí do protokolu. Po odstranění vad díla se opakuje předávací řízení v nezbytně nutném rozsahu.
5. Dílo se považuje za dokončené v okamžiku podpisu protokolu o předání a převzetí předmětu díla oběma smluvními stranami. Předpokladem pro vystavení protokolu o předání a převzetí předmětu díla je řádné splnění díla dle článku I. této smlouvy.

Článek XI.

Změny, vícepráce

1. V průběhu provádění díla může objednatel písemným oznámením zhotoviteli vyžádat změny díla nebo jeho části. Pokud se strany nedohodnou na jiné lhůtě, zhotovitel do 10 dnů po obdržení požadavku objednatele na změnu navrhne a předloží objednateli k odsouhlasení dokument změny díla, který bude obsahovat návrhy zhotovitele na provedení změn a pokud si to změny budou vyžadovat, i návrh na úpravu celkové ceny díla (s podrobnou specifikací) a návrh na úpravu termínu plnění.
2. Schválení dokumentu změny díla objednatel a vyslovení souhlasu s provedením změn bude provedeno takto:
V případě, že bude objednatel po uzavření této smlouvy, v důsledku nových skutečností, požadovat práce nad rámec plnění předmětu díla této smlouvy, bude požadavek na provedení těchto prací uplatněn písemně a takto výslovně označen. Rozsah, cena a termín plnění těchto prací bude před jejich realizací dohodnut mezi stranami v písemném dodatku této smlouvy. Práce nad rámec plnění předmětu díla této smlouvy, jejichž provedení bude mít vliv na cenu díla nebo termíny plnění, mohou být provedeny až po uzavření písemného dodatku k této smlouvě, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. Zhotovitel provede změnu díla v rozsahu a za podmínek dohodnutých smluvními stranami.
3. Zhotovitel připraví a bude uchovávat záznam zachycující povahu, náklady a stav všech změn, jak navrhovaných tak i schválených.
4. Normální vývoj realizace díla a úpravy prováděné zhotovitelem, které směřují k dosažení souladu díla s podmínkami této smlouvy nebo které musí být zhotovitelem provedeny na základě požadavků směřujících k dosažení účelu předmětu díla, nemohou být chápány a vykládány jako změny smlouvy,

nevztahuje se na ně toto ustanovení a nemohou být důvodem ani ke zvýšení ceny díla nebo ke změně termínu plnění.

Článek XII.

Ostatní ujednání

1. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným osobám, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit, není-li to možné, pak finančně uhradit. Náklady s tím spojené nese zhotovitel.
2. Pokud nesplněním některé z povinností zhotovitele vzniknou objednateli náklady nebo vůči zhotoviteli finanční nároky, je objednatel oprávněn započíst takové nároky, tj. od částky fakturované zhotovitelem takové náklady, případně vzniklé finanční nároky, odečíst a zhotoviteli uhradit částku takto upravenou (sníženou).
3. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám s pojistným plněním ve výši nejméně 1 000 000,- Kč. Tato pojistná smlouva tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

Článek XIII.

Náhrada škody

Objednatel je oprávněn požadovat na zhotoviteli a zhotovitel je povinen poskytnout objednateli náhradu škody, kterou zhotovitel způsobil objednateli porušením povinností daných touto smlouvou nebo v souvislosti s plněním této smlouvy, včetně případu, kdy se jedná o takové porušení povinnosti dané touto smlouvou, na které se vztahuje smluvní pokuta.

Článek XIV.

Licenční ujednání

Objednatel je oprávněn použít dílo – předmět této smlouvy – pouze pro účely vyplývající z této smlouvy, zejména pro účely poskytnutí této dokumentace účastníkům výběrových řízení na zhotovitele navazujících projektových dokumentací a na zhotovitele souvisejících staveb, pro účely oprav, úprav a změn této dokumentace a všech stupňů navazujících projektových dokumentací, pro účely rozvedení dokumentace v dalších stupních projektových dokumentací, pro účely dalšího rozpracování a realizování dokumentace, pro účely oprav, úprav, rekonstrukcí a změn souvisejících staveb, to vše vždy i prostřednictvím třetích osob. K použití díla pro jiné účely, než jak vyplývají z této smlouvy a příkladmo jsou uvedeny v tomto odstavci, je třeba souhlasu zhotovitele.

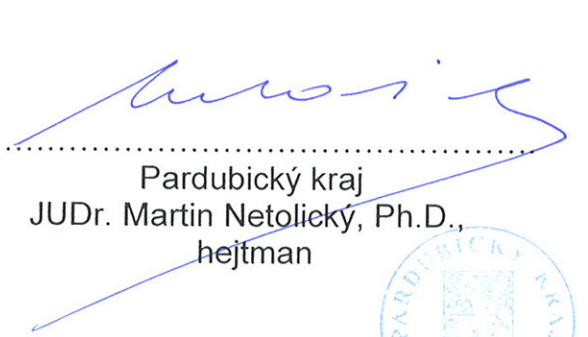
Článek XV. Závěrečná ustanovení

1. Jakékoliv změny této smlouvy jsou platné pouze tehdy, jestliže byly dohodnuty formou číslovaného dodatku k této smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami. Tyto dodatky budou tvořit nedílnou součást této smlouvy.
2. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 - pojistná smlouva č. 2905178501 a příloha č. 2 - formulář k předávacímu protokolu příloha č. 3 - Povinnosti zhotovitele projektové dokumentace vyplývající z finanční spoluúčasti evropských fondů na přípravě a realizaci dopravních projektů v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.
3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
4. Účastníci této smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni ani za jednostranně nevýhodných podmínek.
5. Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží stejnopisy tři a zhotovitel stejnopisy dva.
6. Návrh smlouvy byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne **27. 10. 2015** a schválen usnesením číslo **R/2249/15**.
7. V případě změny údajů uvedených v záhlaví smlouvy týkající se smluvních stran je povinna ta smluvní strana, u které změna nastala informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem, nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne kdy došlo ke změně.

V Pardubicích dne: 26-11-2015

Za objednatele:

Za zhotovitele:


Pardubický kraj
JUDr. Martin Netolický, Ph.D.,
hejtman




HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.
Ing. Václav Starý
prokurista

HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.
Meteor Centre Office Park
Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8
Tel.: 236 080 550, fax: 236 080 560
IČ: 45797170 • DIČ: CZ45797170

PŘÍLOHA č. 1

ke smlouvě o dílo č. **OR/15/24091**

na

**Zhotovení projektové dokumentace na stavbu Modernizace silnice
II/322 od křiž. s III/3224 po nový obchvat Kojic, včetně výkonu
autorského dozoru projektanta**

Pojistná smlouva č. 2905178501





Generali Pojišťovna a.s.
Generální reditelství

Bělehradská 132
120 84 Praha 2
Telefon: (02) 21091 000
Telefax: (02) 21091 100

POJISTNÁ SMLOUVA č. 2905178501

Generali Pojišťovna a.s., Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, IČ 61859869,
zastoupená JUDr. Vlastou Fialovou, vedoucí skupiny pojištění odpovědnosti za škodu
a Mgr. Lucií Krejčí, produktmanažerem skupiny pojištění odpovědnosti za škodu
/dále jen "pojistitel"/

a

DHV CR, spol. s r.o., Praha 3, Táboritská 1000/23, PSČ 130 87
IČ 45 79 71 70, zastoupená Ing. Vladislavem Bízkem, jednatelem
/dále jen "pojištěný"/

uzavírají tuto pojistnou smlouvu o pojištění profesní a provozní odpovědnosti za škodu

1. Všeobecná ustanovení:

Vzájemná práva a povinnosti se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákona.
Vzájemná práva a povinnosti se dále řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro
pojištění profesní odpovědnosti za škody schválenými MF ČR pod č.j.321/66089/1998
ze dne 10. září 1998 /VPPO 98/, příslušnými ustanoveními Smluvních podmínek pro
pojištění profesní odpovědnosti za škodu /SPPO 99/ a touto pojistnou smlouvou .

2. Předmět a rozsah pojištění:

Profesní a provozní odpovědnost za škodu pojištěného na základě pojistných
podmínek dle bodu 1 této pojistné smlouvy.

10 01 07 01 2001 0000 01



Generali Pojišťovna a.s.
Generální ředitelství

Bělehradská 132
120 84 Praha 2
Telefon: (02) 21091 000
Telefax: (02) 21091 300

3. Pojištěný předmět činnosti

- 3.1. Profesní činnost pojištěného na základě Výpisu z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 11622.
- 3.2. Následující činnosti – provádění staveb a projektová činnost - uvedené ve Výpisu z obchodního rejstříku, jsou pojištěny v rozsahu specifikovaném pojištěným a to :
- Provádění staveb - pro účely této smlouvy se tato činnost specifikuje jako souhrn prací zaměřených na dozorování souladu projektu se skutečností, zprostředkování výběrových řízení, koordinace a řízení stavebních prací (s cílem dosáhnout projektovaných kvalitativních a kvantitativních parametrů projektu/stavby).
 - Projektová činnost ve výstavbě a inženýrská činnost v investiční výstavbě – pro účely této smlouvy se tato činnost specifikuje jako souhrn technických, inženýrských a kresličských prací jejichž výstupem je studie nebo projekt, případně koncepce sloužící k vytvoření konkrétního projektu. Dále se definuje jako činnost spočívající např. v propočtu parametrů, zajištění souladu projektu s realizovanou stavbou a obecně platnou legislativou apod.
- V případě změny rozsahu činností pojištěného, je povinen tuto změnu neprodleně pojistiteli oznámit.
- 3.3. Pojištění se odchylně od čl. 9, odst. 7. VPPO 98 vztahuje také na odpovědnost za škodu, způsobenou v důsledku poškození kvality vzduchu, půdy nebo vod /poškozením životního prostředí/, které by bylo zaviněno v přímé souvislosti s jednáním nebo opomenutím pojištěného
- 3.4. V souladu s čl. 5, odst. 2 /Rozšíření pojištění/ se pojištění vztahuje také na odpovědnost za škodu, způsobenou tzv. provozní činností pojištěného /ve smyslu § 420 občanského zákona/ zejména v těch případech, kdy pojištěný vystupuje jako stavebník, stavitel, generální dodavatel apod.

4. Pojistná částka:

- 4.1. Paušální pojistná částka pro pojištění profesní odpovědnosti za škodu činí:

15.000.000,- Kč



Generali Pojišťovna a.s.
Generální ředitelství

Bělehradská 132
120 84 Praha 2
Telefon: (02) 21091 000
Telefax: (02) 21091 300

- 4.2. Sublimit paušální pojistné částky
pro pojištění provozní odpovědnosti
za škodu činí: **5.000.000,- Kč**
- 4.3. Paušální pojistná částka (15.000.000,- Kč)
se vztahuje na škodní události dle VPPO 98 čl.4 odst.2 a 3
(škody na životě a zdraví, věcná škoda, následky škody na životě,
na zdraví a věci, jiná majetková škoda)
- 5. Spoluúčast:**
- 5.1. Spoluúčast pojištěného na každé pojistné události činí
10% ze vzniklé škody, avšak minimálně 10.000,- Kč
- 6. Pojistné a úhrada pojistného**
- 6.1. Roční pojistné bylo kalkulováno na základě výše obratu
pojištěného z předmětné profesní a provozní činnosti
ve výši 50.000.000,- Kč a činí: **46.800,- Kč**
- 6.2. Pojistné je splatné jednorázově na účet pojistitele na základě
platebního dokladu, vystaveného pojistitelem
- 7. Počátek a doba trvání pojištění**
Pojistná smlouva se uzavírá s účinností ke dni 20.9. 2002 od 0.00 hod.
a uzavírá se na dobu neurčitou s pojistným obdobím jeden rok ve smyslu
Čl. 11 VPPO 98. Po uplynutí ročního pojistného období je pojistná
smlouva automaticky prodlužována vždy o jeden rok, není-li nejpozději
6 týdnů před uplynutím její platnosti některou ze stran vypovězena.

7.



Generali Pojišťovna a.s.
Generální ředitelství


Bělehradská 132
120 84 Praha 2
Telefon: (02) 21091 000
Telefax: (02) 21091 300

8. Závěrečná ustanovení


- 8.1. Součástí pojistné smlouvy jsou Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škody schválené MF ČR pod č.j. 321/66089/1998 ze dne 10. září 1998 /VPPO 98/ a Smluvní podmínky pro pojištění profesní odpovědnosti za škodu /SPPO 99/
- 8.2. Pojištěný prohlašuje, že byl seznámen s obsahem pojistných podmínek a je si vědom, že na případná ústní ujednání neobsažená ve výše uvedených textech nebude brán zřetel.
- 8.3. Pojištěný prohlašuje, že odpověděl pravdivě a úplně na všechny dotazy a bere na vědomí, že případné změny je povinen ohlásit písemně pojistiteli do 15 dnů od jejich vzniku.
- 8.4. Smlouva se pro potřeby smluvních stran vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom exempláři.

Přílohy:
VPPO 98
SPPO 99

V Praze, dne 20.9.2002


Generali Pojišťovna a.s.

DHV CR, spol. s r.o.
Táboritká 23
130 87 Praha 3
Tel.: 02/67 09 23 50 Fax: 02/67 09 23 60
IČO: 45797170


DHV CR, spol. s r.o.



Generali Pojišťovna a.s.
Generální ředitelství
Bělehradská 132
120 84 Praha 2
Česká republika

DODATEK č. 1 k : POJISTNÉ SMLOUVĚ č. 2905178501

Generali Pojišťovna a.s.,
Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, Česká republika, IČ: 61859869,
za níž jedná Pavel Otiepka, odborný referent pojištění podnikatelských a průmyslových rizik a Ing.
Miloš Jasanský odborný inspektor pojištění majetku
(dále jen "pojistitel")

uzavírá s níže uvedenou právnickou osobou

DHV CR, spol. s r.o., Táboritská 23, 130 87 Praha 3, IČ: 45797170, zapsaná v OR vedeném MS
v Praze, oddíl C, vložka 11622, zastoupena zplnomocněným zástupcem společnosti
(dále jen "pojistník/pojištěný")

následující dodatek pojistné smlouvy na pojištění profesní a provozní odpovědnosti za škodu

1. Na základě písemného oznámení pojistitele se mění sídlo a místo pojištění ke dni 5.2.2007 takto:

Nové sídlo a místo pojištění: Sokolovská 100/94,
186 00 Praha 8

2. Ostatní body a články pojistné smlouvy se nemění.
3. Tento dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu a je účinný ke dni 5.2.2008.
4. Závěrečná ustanovení

Dodatek obsahuje 1 stranu, vyhotovuje se ve 2 exemplářích s platností originálu, z nichž jeden obdrží pojistitel a jeden pojistník..

V Praze, dne 10.3.2008.2007

V PRAZE, dne 11.3.2008

Generali Pojišťovna a.s.
(Pojistitel)

DHV CR, spol. s r.o.,
(Pojistník)

Dodatek smlouvy vyhotoví:
Pavel Otiepka
 **Generali Pojišťovna a.s.** M258
podpora regionálních makléřů
OA Praha a střední Čechy
Vinohradská 174/1957, 130 00 Praha 3
telefon: 221 099 961, fax: 221 099 966



**DODATEK č. 2- K POJISTNÉ SMLOUVĚ 2905178501 na pojištění
profesní a provozní odpovědnosti za škodu ze dne 20.9.2002**

Generali Pojišťovna a.s., Bělehradská 132, 120 84 Praha 2 Česká republika, IČ: 61859869,
zastoupená oprávněnými osobami Ing. Zdeněk Šafránek upisovatel makléřských obchodů regionu
Praha a Milena Řeřichová upisovatel makléřských obchodů regionu Praha
(dále jen „pojistitel“)

a
HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o. IČ: 45797170... (dále jen „pojistník“)

Se dohodli na změně pojistné smlouvy ke dni 16.5.2013 - změna názvu firmy:


A: Změny nemající vliv na výši pojistného


Původní název – DHV CR, spol. s r.o. Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8
Nový název – HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o. Sokolovská 100/94,
186 00 Praha 8, IČ stejné 45797170

Ostatní body a články pojistné smlouvy se nemění.

Dodatek pojištění je účinný následující den (00.00 hod) po přijetí dodatku, případně od pozdějšího data
uvedeného v dodatku jako datum účinnosti dodatku. Dodatek k pojistné smlouvě může vypovědět každá strana
do dvou měsíců po datu účinnosti dodatku. Výpovědní lhůta je osmidenní. Tento dodatek se stává součástí
pojistné smlouvy mezi pojistníkem a pojistitelem a platí pro něj všechny pojistné podmínky a písemná ujednání
obsažená v pojistné smlouvě. Pojistník / pojištěný prohlašuje, že odpověděl pravdivě a úplně na všechny dotazy a
bere na vědomí, že případné změny je povinen bez zbytečného odkladu písemně ohlásit pojistiteli. Pojistná
smlouva o škodovém pojištění podnikání se mění pouze ve výše uvedených ustanoveních, ostatní ustanovení
pojistné smlouvy zůstávají v platnosti a nezměněna.

V Praze, dne 21.5.2013


Generali Pojišťovna a.s. G977
makléřské obchody – region Praha
Bělehradská 174, 130 00 Praha 3
telefon: 224 000 881
.....
Pojistitel


.....
Pojistník
Ing. VÁCLAV STARY
PROKURISTA

HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.
Meteor Centre Office Park
Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8
Tel.: 236 080 550, fax: 236 080 560
IČ: 45797170 • DIČ: CZ45797170

Název stavby/projektu: „Zhotovení projektové dokumentace na stavbu Modernizace silnice II/322 od křiž. s III/3224 po nový obchvat Kojic, včetně výkonu autorského dozoru projektanta“

Stupeň projektové dokumentace: (Doplň zpracovatel PD)

Zpracovatel projektové dokumentace: (Doplň zpracovatel PD)

Náležitost	Ano/Ne	Odkaz na náležitost v PD (Část/strana)
název stavby/projektu je ve všech částech dokumentace v souladu se SOD		
rozsah dokumentace odpovídá stupni PD		
dokumentace obsahuje záborový elaborát		
paré č. 1 obsahuje dokladovou část s originály dokladů		
dokumentace je podepsána odpovědným projektantem a opatřena autorizačním razítkem		
digitální zpracování obrazové části ve formátu 1X CD v DWG a 1 x CD v PDF		
textová část ve formátu Microsoft Word		
tabulky ve formátu Microsoft Excel nebo Microsoft Word		
výkaz výměr v obecném rozpočtovém formátu (ORF) a ve formátu Microsoft Excel		
počet paré odpovídá SOD		
k dokumentaci je přiložen návrh žádosti stavebníka o vydání ÚR nebo SP vč. všech potřebných dokladů		
paré č. 1 a 2 dokumentace pro stavební povolení obsahuje statické výpočty		
součástí PD jsou souhlasy, popř. stanoviska vlastníků pozemků k záborům		
součástí dokladové části je zápis z projednání dokumentace v závěru prací s objednatelem, popř. výstupní protokol dokumentačního výboru v případě dopravních staveb		
stanovisko budoucího uživatele (ředitele PO)		
v dokumentaci jsou zpracovány všechny připomínky objednatele, závěry výstupního protokolu dokumentačního výboru a ředitele PO		
u jednotlivých stavebních objektů je uveden kód CPV, CZ-CPA, CZ-CC a JKSO		
projektová dokumentace obsahuje plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a projekt ZOV		
součástí projektové dokumentace na dopravní stavby je diagnostika dle platných TP v rozsahu dle SOD		
oceněný výkaz výměr je uveden bez DPH, u všech položek je stanovena sazba DPH a uvedena cena včetně DPH		
rozsah dokumentace pro podání žádosti o vydání územního rozhodnutí odpovídá příloze č. 4 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení		
rozsah dokumentace pro podání žádosti o vydání		

stavebního povolení odpovídá příloze č. 1 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb		
v případě dopravních staveb je dokumentace zpracována v souladu s vyhláškou 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb		
dokumentace pro zadání stavby je zpracována do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky pro realizaci stavby dle § 44 – 47 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů		
text dokumentace je v souladu s Příručkou pro žadatele a příjemce v rámci daného operačního programu a neobsahuje výrazy <i>oprava</i> nebo <i>údržba</i>		
součástí dokumentace a výkazu výměr je dodávka a montáž velkoplošných billboardů a pamětních desek v rozsahu dle přílohy k Příručce pro žadatele a příjemce v rámci daného operačního programu – Pravidla povinné publicity		

Datum:

Jméno zodpovědného projektanta

Podpis zodpovědného projektanta:



Příloha č. 3 ke Smlouvě č. OR/15/24091

Povinnosti zhotovitele projektové dokumentace vyplývající z finanční spoluúčasti evropských fondů na přípravě a realizaci dopravních projektů v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (dále IROP)

1. Zhotovitel se zavazuje archivovat veškeré dokumenty související s dílem (Smlouvy o dílo včetně jejich případných dodatků, originály účetních a daňových dokladů, originály projektové dokumentace, atp.) po dobu stanovenou právními předpisy ČR a poskytovatelem dotace, nejméně však po dobu 10 let od vydání pravomocného kolaudačního rozhodnutí (kolaudačního souhlasu), nebo finančního vypořádání projektu, nejméně však do 31. prosince 2025.
2. Zhotovitel se zavazuje plnit povinnosti vyplývající z podmínek uvedených v platné verzi výzvy IROP. Aktuální dokumenty jsou uvedeny na internetových stránkách <http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Uvodni-strana>
<http://www.rada-severovychod.cz/irop>
3. Povinnosti zhotovitele vyplývající ze spoluúčasti na přípravě projektu v rámci IROP:
 - a) Každý originální účetní doklad musí obsahovat informace, že se jedná o projekt související s IROP, a dále musí obsahovat přesný název projektu a registrační číslo projektu. Faktura musí obsahovat účel fakturovaných částek a přesnou specifikaci jednotlivých způsobilých a nezpůsobilých výdajů. Metodika způsobilých výdajů je k dispozici na příslušných internetových stránkách IROP.
 - b) Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
 - c) Zhotovitel se ve spolupráci s objednatelem zavazuje poskytnout bezodkladně kontrolním orgánům jakékoliv dokumenty vztahující se k předmětu projektu, podat informace a umožnit vstup do svého sídla v souvislosti s předmětem díla.
 - d) Zhotovitel se zavazuje poskytnout na výzvu své daňové účetnictví nebo daňovou evidenci k nahlédnutí v rozsahu, který souvisí s předmětem díla.
 - e) Zhotovitel se dále zavazuje provést v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě opatření k odstranění kontrolních zjištění a informovat o nich příslušný kontrolní orgán, objednatele a poskytovatele dotace.
 - f) Kontrolními orgány se rozumí osoby pověřené ke kontrole Evropskou komisí, Evropským účetním dvorem, Nejvyšším kontrolním úřadem, Ministerstvem financí ČR, Ministerstvem pro místní rozvoj, Centrem pro regionální rozvoj České republiky, jakož i dalšími orgány oprávněnými k výkonu kontroly (např. státní stavební dohled).



- g) Zhotovitel bere na vědomí, že poskytovatel dotace je oprávněn provést u projektu nezávislý vnější audit. Zhotovitel je povinen při výkonu auditu spolupůsobit.
- h) Zhotovitel se zavazuje písemně poskytnout na žádost objednatele jakékoliv doplňující informace související s předmětem smlouvy a to ve lhůtě stanovené objednatelem.
- i) Ve fázi realizace projektu v rámci povinné publicity musí být umístěn na začátku a na konci modernizovaného úseku silnice billboard velikosti aktivní plochy 5,1 x 2,4 m s informačním textem dle pokynů objednavatele a dále musí být v závěru realizace umístěna v místě projektu pamětní deska velikosti aktivní plochy minimálně 300 x 400 mm vyrobená z trvanlivého materiálu s informačním textem dle pokynů objednatele. Zhotovitel tento požadavek zapracuje do projektové dokumentace.
4. Zhotovitel je povinen dodržet pravidla pro publicitu, zejména označení všech výstupů (dokumentace, CD apod.) logy EU a IROP dle aktuálně platných pravidel pro publicitu IROP.
5. Na všech výkresech – legendách, rozpiskách, ve všech zprávách a textech bude uveden správný, úplný a stejný název projektu (včetně pomlček, mezer apod.), dle pokynů objednatele tak, aby byl v souladu s názvem, pod kterým bude projekt předkládán jako žádost o spolufinancování.
6. Nikde v projektu nebude uveden konkrétní název dodavatele ani konkrétní název / typ výrobku – je třeba je slovně popsat konkrétními parametry výrobku / dodávky / materiálu.
7. Kompletní položkový rozpočet + soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (vše na základě detailních položek; soubory či agregované položky nejsou přípustné) budou doloženy v elektronické podobě ve formátu MS Excel, který bude kompatibilní s datovým předpisem elektronického formátu XC4. Struktura všech částí rozpočtu musí minimálně obsahovat následující položky v samostatných sloupcích: kód položky, název položky (popis), měrná jednotka, množství, cena/MJ, celkem v Kč.
8. V elektronické podobě rozpočtu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr musí být patrné (označeno např. nadpisem), které položky patří pod hlavní stavební výrobu, přidruženou stavební výrobu a montáž. Položky konstrukce, materiál, nadpis apod. musí být od sebe odlišeny rozdílným formátem (např. kurzívou, stylem písma).
9. V rozpočtu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr nesmí být uvedeny žádné položky označeny jako „rezerva“, „provozní vlivy“ nebo „provoz investora“. Uznatelné jsou pouze jasně definované položky rozpočtu přímo související s realizací projektu.
10. Zařízení staveniště bude u relevantních stavebních či inženýrských objektů v rozpočtu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr uvedeno procentem i konkrétní částkou.
11. Součty jednotlivých položek musí odpovídat součtovým řádkům/souhrnným částkám v krycích listech.
12. V žádných částech projektové dokumentace (včetně rozpočtu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr) nesmí být uvedeno slovo „oprava“ nebo „údržba“. Tyto výrazy musí být nahrazeny (ve smyslu příslušného

textu) výrazy např. modernizace, rekonstrukce, úprava (příklad úprava objízdných tras).

13. Bez ohledu na to, kdo zajišťuje projektovou dokumentaci (např. Pk nebo SÚS Pk), bude investorem projektu (stavby), žadatelem o dotaci a příjemcem dotace Pardubický kraj.
14. Pokud je rámci projektové dokumentace a stavby uvažováno s využitím vybouraného, demontovaného, vytěženého (např. odfrézovaného) materiálu, pak v rozpočtu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr musí být uvedeno jeho množství včetně měrné jednotky (resp. ceny) a způsob využití (např. zpětné zásypy, zpevnění podloží, sanace vozovky). Množství tohoto materiálu musí být přesně vyspecifikováno. Využití recyklátu je důležitým environmentálním kritériem projektu, jehož splnění na konci realizace projektu (v závěrečné monitorovací zprávě) musí příjemce dotace řídicímu orgánu poskytovatele dotace prokázat.
